

## 01 / 06 Synthese van de controle

COVER

## VOORWERP VAN HET RAPPORT

**Elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning**

Boek 1 — KB 8/9/2019 · Algemene Directie Energie

Dendermondse Steenweg 4, 9080 Lochristi

CONTROLEDATUM

14/09/2026

HERCONTROLE VOOR

14/09/2027

AGENT-BEZOEKER

Peter D'hooge

## CONCLUSIE VAN DE CONTROLE

**Installatie niet conform**

De installatie vertoont vaststellingen die moeten worden verholpen (zie detail hieronder).

**05**

INBREUKEN

## RESULTATEN VAN DE CONTROLES

2 metingen — 1 binnen de grenzen · 1 buiten de grens · 11 controlepunten — 5 conform · 6 niet conform

Detail op pagina 04. Schema's &amp; plannen in bijlage : Schema / Plan. Document geïmprimeerd door de inspecteur, integraal deel van dit rapport.

## – Identificatie van de partijen

BELANGHEBBENDEN

## OPDRACHTGEVER

**Keurhuis**

ADRES

Forelstraat 5,  
8020 Oostkamp

## EIGENAAR / UITBATER

**De Baere - Temmerman**

ADRES

Dendermondse Steenweg 4,  
9080 Lochristi

## INSTALLATEUR

**Onbekend**

BTW

— Niet ingevuld

## – Identificatie van de installatie

VOORWERP

Type gebouw Eengezinswoning

Meternummer 1SAG3200367956

Distributienetbeheerder Fluvius

EAN 541 448 820 045 723 429

**Atlas Contrôle VZW**  
ERKENDE ORGANISMEZETEL Boulevard Lambermont 127, 1030 Schaerbeek  
TEL +32 2 726 64 04  
MAIL office@atlascontrole.be  
BTW BE 0732 536 476 · RPR Brussel

## 02 / 06 Inhoudsopgave

INHOUD

|    |                                                                              |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01 | Synthese & identificatie — Conclusie · partijen · installatie                | blz. 01 |
| 02 | Reglementair kader — Basis · type controle · beschrijving                    | blz. 02 |
| 03 | Vaststellingen — Detail per AREI-artikel                                     | blz. 03 |
| 04 | Elektrische metingen — Gemeten waarden                                       | blz. 04 |
| 05 | Elektrische borden — Detail per bord · vaststellingen · observaties & foto's | blz. 06 |
| 06 | Attest & handtekening — Visum · geldigheid · vermeldingen                    | blz. 10 |

## – Reglementaire basis

TOEGEPASTE REFERENTIEKADERS

## AREI Boek 1

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KB van 08/09/2019

## KB 08/09/2019

Algemene Directie Energie — LS/ZLS-installaties

B.S. 28/10/2019

## – Type controle

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Type controle                 | Periodieke Inspectie (6.5)      |
| Inrichting van de installatie | Tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 |
| Type installatie              | Huishoudelijk — driefasig       |
| Aardingsstelsel               | TT                              |
| Procedure                     | Visueel + metingen              |

## – Beschrijving van de installatie en de aansluiting

KENMERKEN

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Verbinding meter — bord     | XVB · 4X10 mm <sup>2</sup> |
| Bedrijfsspanning            | 3 × 400 V + N – 50 Hz      |
| Hoofdbeveiliging            | 32 A                       |
| Maximale beveiliging        | 32 A                       |
| Algemene schakelaar         | Algemene schakelaar 4P     |
| Aantal borden               | 3                          |
| Eindstroombanen             | 39                         |
| Aardingselektrode           | Aardingslus                |
| Spreidingsweerstand         | 1.56 Ω                     |
| Equipotentiale verbindingen | Niet conform               |

## 03 / 06 Vaststellingen

5 TE CORRIGEREN

De inbreuken verwijzen naar het overeenkomstige AREI-artikel en moeten worden weggewerkt vóór de volgende controle. De opmerkingen zijn waarnemingen buiten codificatie, zonder correctieverplichting.

|                                                                       |                                                                       |                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>05</b><br>INBREUKEN<br>Veiligheid - te corrigeren vóór hercontrole | <b>00</b><br>OPMERKINGEN<br>Waarnemingen — geen correctieverplichting | <b>00</b><br>INFORMATIE<br>Niet-blokkerende aanbevelingen | <b>12</b><br>MAANDEN UITSTEL<br>Om de inbreuken weg te werken |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| #  | ARTIKEL | VASTSTELLING                                                                                                                                                                                                                                                     | LOCATIE                | ERNST     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 01 | 4.2.3.2 | De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden.                                                                                                                                                                          | Installatie (algemeen) | ● INBREUK |
| 02 | 4.2.2.3 | Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.                                                                                                                                        | Verdeelbord            | ● INBREUK |
| 03 | 5.3.5.1 | De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.                                                                                                                                                                            | Verdeelbord            | ● INBREUK |
| 04 | 5.3.6.1 | De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden. Aanduiden met letters niet met cijfers.                                                                                                  | Verdeelbord (2)        | ● INBREUK |
| 05 | 6.4.5.1 | De waarde van de isolatieweerstand, gemeten onder de testspanningen, moet voor elke kring, waarbij de verbruikstoestellen afgekoppeld zijn, minstens gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van de testspanning (minimum 0,5MΩ bij een testspanning van 500V). | Installatie (algemeen) | ● INBREUK |

**Vervolg.** De inbreuken moeten worden weggewerkt door een gekwalificeerd installateur binnen een termijn van maximaal 12 maanden vanaf dit rapport. Op aanvraag wordt een gedeeltelijke hercontrole uitgevoerd, beperkt tot de vastgestelde punten, zonder volledig nieuw bezoek zolang de reikwijdte identiek blijft.

## 04 / 06 Elektrische metingen


2 WAARDEN

Op locatie gemeten waarden (tester: Siconia XT211). Elke meting wordt vergeleken met de toepasselijke reglementaire limiet.

## AARDINGSWEERSTAND

1.56  $\Omega$ 

Limiet < 100  $\Omega$  - differentieelschakelaars volgens Boek 1 **CONFORM**

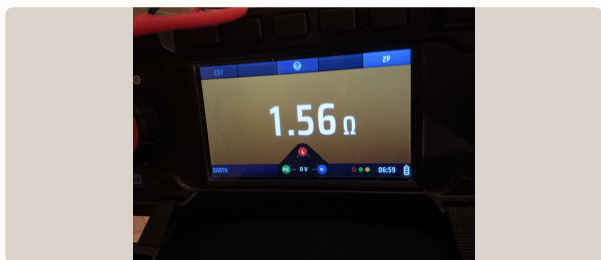

## ISOLATIEWEERSTAND

0.1 M $\Omega$ 

Limiet  $\geq$  0.5 M $\Omega$  **BUITEN LIMIET**



## – Uitgevoerde controles

11 PUNTEN

Tijdens het bezoek uitgevoerde controleverrichtingen, met hun resultaat (AREI Boek 1).

| CONTROLEPUNT                                                                                                                                                                                                                          | VEREISTE           | STAAT          | OPMERKING |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Uitvoering van de installatie conform de eendraadsschema's en situatieplannen                                                                                                                                                         | RGIE 6.5.7.2.b.4.a | • CONFORM      | —         |
| Staat van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel (bevestigingen, beschadigingen)                                                                                                                                                 | RGIE 6.5.7.2.b.4.b | • NIET CONFORM | —         |
| Aansluitingen in de verdeel- en schakelborden                                                                                                                                                                                         | RGIE 6.5.7.2.b.4.b | • NIET CONFORM | —         |
| Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking                                                                                                                                                                    | RGIE 6.5.7.2.b.4.c | • NIET CONFORM | —         |
| Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking                                                                                                                                                                  | RGIE 6.5.7.2.b.4.c | • NIET CONFORM | —         |
| Werkings van de differentieelschakelaars via hun eigen testknop                                                                                                                                                                       | RGIE 6.5.7.2.b.4.d | • NIET CONFORM | —         |
| Foutlussen en aansluiting van de differentieelschakelaars (foutstroom 2,5–2,75 $\times$ I $\Delta$ n)                                                                                                                                 | RGIE 6.5.7.2.b.4.e | • CONFORM      | —         |
| Continuïteit van de equipotentiaalverbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de contactdoosokkels en van het vast, op vaste plaats of verplaatsbaar op vaste plaats geïnstalleerd materieel van klasse I | RGIE 6.5.7.2.b.4.f | • NIET CONFORM | —         |

|                                                                                                                             |                    |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---|
| Visuele controle van het vast of op vaste plaats geïnstalleerd materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen | RGIE 6.5.7.2.b.4.g | • CONFORM | — |
| Visuele controle van het verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen                         | RGIE 6.5.7.2.b.4.h | • CONFORM | — |
| Overeenstemming van de beveiligingen tegen overstroom met de doorsneden van de beschermde stroombanen                       | RGIE 6.5.7.2.b.4   | • CONFORM | — |

## – Overzicht van het bord

SCHAKELBORDEN

Algemene aanvoer en synthese van het bord. Het detail per bord staat op pagina 5.

### ALGEMENE AANVOER

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Aanvoerkabel         | XVB · 4X10 mm <sup>2</sup> |
| Hoofdbeveiliging     | 32 A                       |
| Scheidingsschakelaar | 4P                         |
| Voeding              | 3 × 400 V + N · Fluvius    |

**39**

AUTOMATEN

**03**

DIFFERENTIËLEN

**02**

WAARVAN 30 MA


## 05 / 06 Elektrische borden

3 BORDEN

Detail per bord: vermogenschakelaars, differentieelschakelaars, foto's en bijbehorende vaststellingen. Het volledige reglementaire detail staat op pagina 3.

## 01 Verdeelbord

VERDEELBORD

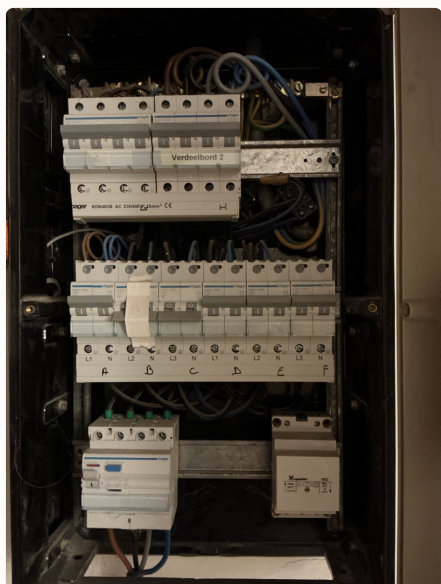

## VERMOGENSCHAKELAARS

4

| AANTAL | SECTIE              | KALIBER (A) | CURVE | TYPE                    | OPMERKINGEN |
|--------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|
| 2      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 16 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 4      | 2.5 mm <sup>2</sup> | 16 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 1      | 4 mm <sup>2</sup>   | 25 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 1      | 10 mm <sup>2</sup>  | 40 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |

## DIFFERENTIEELSCHAKELAARS

1

| BESCHRIJVING           | NOMINALE STROOM | GEVOELIGHEID (mA) | TYPE | TOESTAND        |
|------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 40 A · 300 mA · Type A | 40 A            | 300 mA            | A    | <span>OK</span> |

## VASTSTELLINGEN


3 INBREUKEN

- 4.2.2.3 Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.
- 5.3.5.1 De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.
- 5.3.6.1 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden. Aanduiden met letters niet met cijfers.

02

## Verdeelbord

VERDEELBORD

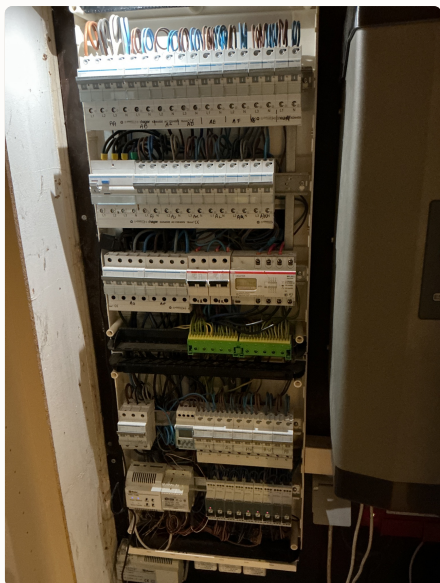

## VERMOGENSCHAKELAARS

5

| AANTAL | SECTIE              | KALIBER (A) | CURVE | TYPE                    | OPMERKINGEN |
|--------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|
| 5      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 16 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 2      | 2.5 mm <sup>2</sup> | 16 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 12     | 2.5 mm <sup>2</sup> | 20 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 1      | 6 mm <sup>2</sup>   | 20 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |
| 2      | 10 mm <sup>2</sup>  | 40 A        | C     | Automatische schakelaar | —           |

## DIFFERENTIEELSCHAKELAARS

1

| BESCHRIJVING          | NOMINALE STROOM | GEVOELIGHEID (mA) | TYPE | TOESTAND        |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 40 A · 30 mA · Type A | 40 A            | 30 mA             | A    | <span>OK</span> |

## VASTSTELLINGEN


3 INBREUKEN

- 4.2.2.3 Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.
- 5.3.5.1 De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.
- 5.3.6.1 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden. Aanduiden met letters niet met cijfers.

03

## Verdeelbord

VERDEELBORD

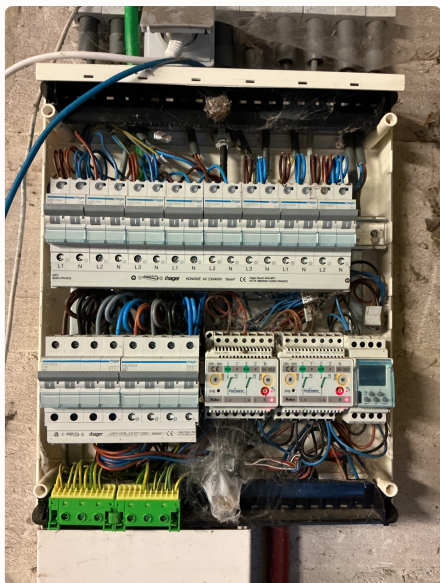

## VERMOGENSCHAKELAARS

4

| AANTAL | SECTIE              | KALIBER (A) | CURVE | TYPE                    | OPMERKINGEN |
|--------|---------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|
| 1      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 16 A        | C     | Automatische schakelaar | –           |
| 1      | 2.5 mm <sup>2</sup> | 16 A        | C     | Automatische schakelaar | –           |
| 6      | 2.5 mm <sup>2</sup> | 20 A        | C     | Automatische schakelaar | –           |
| 1      | 4 mm <sup>2</sup>   | 25 A        | C     | Automatische schakelaar | –           |

## DIFFERENTIEELSCHAKELAARS

1

| BESCHRIJVING          | NOMINALE STROOM | GEVOELIGHEID (mA) | TYPE | TOESTAND        |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 40 A · 30 mA · Type A | 40 A            | 30 mA             | A    | <span>OK</span> |

## VASTSTELLINGEN

3 INBREUKEN

- 4.2.2.3 Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.
- 5.3.5.1 De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.
- 5.3.6.1 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden. Aanduiden met letters niet met cijfers.

## – Observaties &amp; foto's

VISUELE BIJLAGE

Visuele vaststellingen tijdens de inspectie. De foto's worden bewaard onder interne referentie en kunnen op schriftelijke aanvraag worden bezorgd.

OBSERVATIE 01

Inspectiefoto

INSPECTIE



OBSERVATIE 02

Inspectiefoto

INSPECTIE



FOTO'S VAN DE INSTALLATIE

3



Schakelbord



Meter / aansluiting



Aardingsklem

## 06 / 06 Attest & handtekening

GELDIGHEID VAN HET RAPPORT

Dit rapport bevestigt de staat van de elektrische installatie op de controledatum. Het loopt niet vooruit op latere wijzigingen.

### VOOR ATLAS CONTRÔLE VZW

**Peter D'hooge**

Agent-Bezoeker



Handtekening van de inspecteur aangebracht op  
14/09/2026

### VISUM & GELDIGHEID

Organisme Atlas Contrôle VZW · BELAC 663

Controledatum 14/09/2026

Uitgiftedatum 14/09/2026

Hercontrole voor 14/09/2027

Referentie DOM-2026-ZZ4KBQ

Dit rapport wordt afgeleverd en ondertekend door de bezoeker van Atlas Contrôle. Geen handtekening van de opdrachtgever is vereist voor de geldigheid.

## – Vermeldingen & reikwijdte

**1. Referentiekader.** Deze controle wordt uitgevoerd overeenkomstig het AREI (Boek 1, KB van 08/09/2019).

**2. Reikwijdte.** Het rapport heeft enkel betrekking op zichtbare en toegankelijke installaties. Ingewerkte, verzegelde of ontoegankelijke delen worden niet in detail onderzocht.

**3. Geldigheid.** Voor een conform verklaarde installatie is het rapport 25 jaar geldig voor woningen, 1 jaar voor werfinstallaties (art. 6.5.2) en 5 jaar voor de overige installaties, behoudens substantiële wijziging.

**4. Hercontrole.** Bij niet-conformiteit kan een hercontrole — beperkt tot de vastgestelde punten — worden gevraagd na herstelling door een gekwalificeerd installateur.

**5. Vertrouwelijkheid.** Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en de aangeduide partijen. Gedeeltelijke reproductie is verboden.

**6. Klachten.** Elk bezwaar moet binnen 15 dagen na ontvangst van het rapport schriftelijk worden gericht aan [office@atlascontrole.be](mailto:office@atlascontrole.be).

### ATLAS CONTRÔLE VZW

Boulevard Lambermont 127 · 1030 Schaerbeek  
BELAC 663 · TVA BE 0732 536 476  
[office@atlascontrole.be](mailto:office@atlascontrole.be) · +32 2 726 64 04

### UNIEKE REFERENTIE

DOM-2026-ZZ4KBQ

[atlascontrole.be/v/DOM2026ZZ4KBQ](https://atlascontrole.be/v/DOM2026ZZ4KBQ)



## – Reglementair besluit

AREI BOEK 1

Vermeldingen opgelegd door het AREI Boek 1 (KB 8/09/2019) naargelang het type controle, het type gebouw en het besluit.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Een aanvullend bezoek moet door Atlas Controle worden uitgevoerd vóór 14/09/2027.

De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd, en alle gepaste maatregelen moeten worden getroffen opdat de inbreuken, in geval van handhaving van de installaties in gebruik, geen gevaar vormen voor personen en goederen.

### **Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie**

1. De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
2. De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.
3. De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.
4. Indien er tijdens het inspectiebezoek inbreuken worden vastgesteld, is Atlas Contrôle verplicht een nieuw inspectiebezoek uit te voeren om na te gaan of de inbreuken na de periode van één jaar verdwenen zijn. Indien bij dit tweede bezoek inbreuken blijven bestaan, is Atlas Contrôle verplicht een kopie van het verslag te bezorgen aan de Algemene Directie Energie belast met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.





**Erkend Organisme**  
Atlas Contrôle asbl  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Scharbeek  
Tel.: 02 726 64 04  
e-mail: info@atlascontrole.be  
BE 0732.536.476

Atlas Contrôle VZW · BELAC 663-INSP · Peter D'hooge  
Installatie: Dendermondse Steenweg 4, 9080 Lochristi

**Plaats van de elektrische installatie**  
De Baere - Temmerman  
Dendermondse Steenweg 4  
9080 Lochristi

**Installateur**  
VDK Keurgroep  
Forelstraat 5  
8020 Oostkamp




**p. 2/6**  
**Eendraadschema**


3 x 400V + N ~ 50Hz

Geviseerd door de inspecteur · 14/09/2026

**Schema's getekend door: Plan-J - BE0803849985**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Erkend Organisme</b><br>Atlas Contrôle asbl<br>Boulevard Lambermont 127<br>1030 Scharbeek<br>Tel.: 02 726 64 04<br>e-mail: info@atlascontrole.be<br>BE 0732.536.476<br><small>Atlas Contrôle VZW · BELAC 663-INSP · Peter D'hooge</small><br><small>Installatie: Dendermondse Steenweg 4, 9080 Lochristi</small> | <b>Plaats van de elektrische installatie</b><br>De Baere - Temmerman<br>Dendermondse Steenweg 4<br>9080 Lochristi | <b>Installateur</b><br>VDK Keurgroep<br>Forelstraat 5<br>8020 Oostkamp<br><br><small>Geviseerd door de inspecteur · 14/09/2026</small> | <b>p. 3/6</b><br><b>Eendraadschema</b><br><br>3 x 400V + N ~ 50Hz |
| <b>Schema's getekend door: Plan-J - BE0803849985</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |

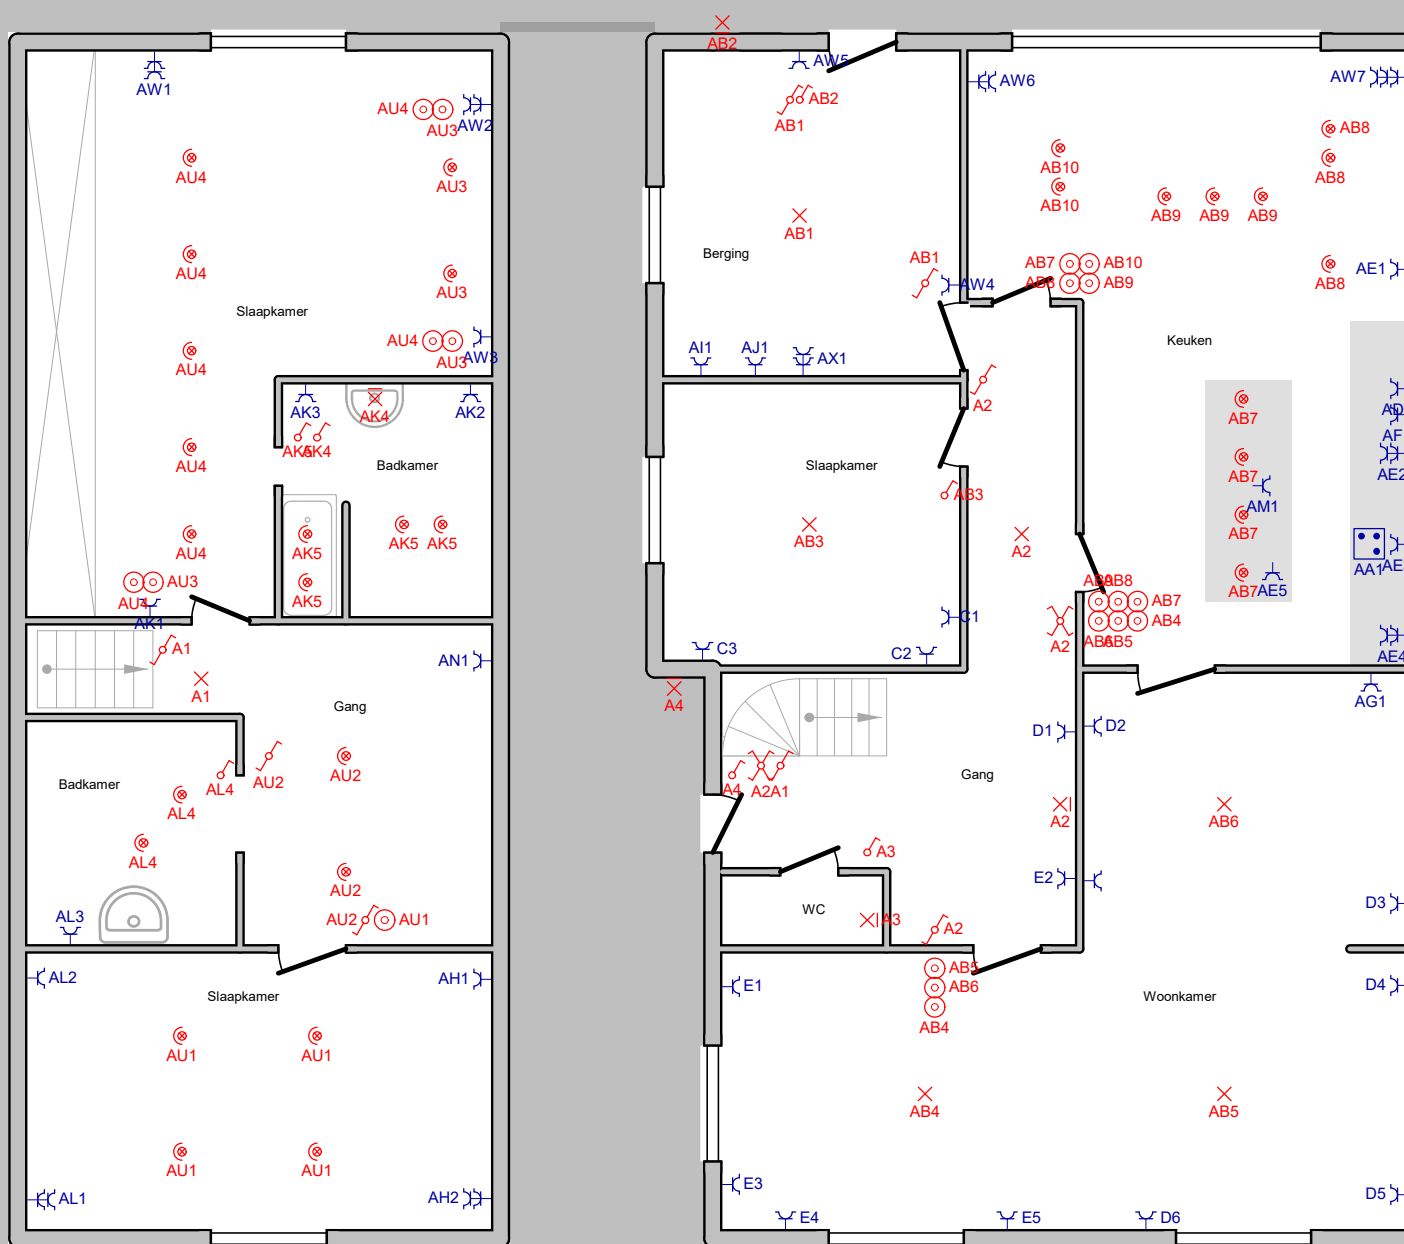**Erkend Organisme**

Atlas Contrôle asbl  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Scharbeek  
Tel.: 02 726 64 04  
e-mail: info@atlascontrole.be  
BE 0732.536.476

Atlas Contrôle VZW · BELAC 663-INSP · Peter D'hooge

Installatie: Dendermondse Steenweg 4, 9080 Lochristi

**Plaats van de elektrische installatie**

De Baere - Temmerman  
Dendermondse Steenweg 4  
9080 Lochristi

**Installateur**




VDK Keurgroep  
Forelstraat 5  
8020 Oostkamp

  
VDK Keurgroep

**p. 4/6****Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

Geviseerd door de inspecteur · 14/09/2026

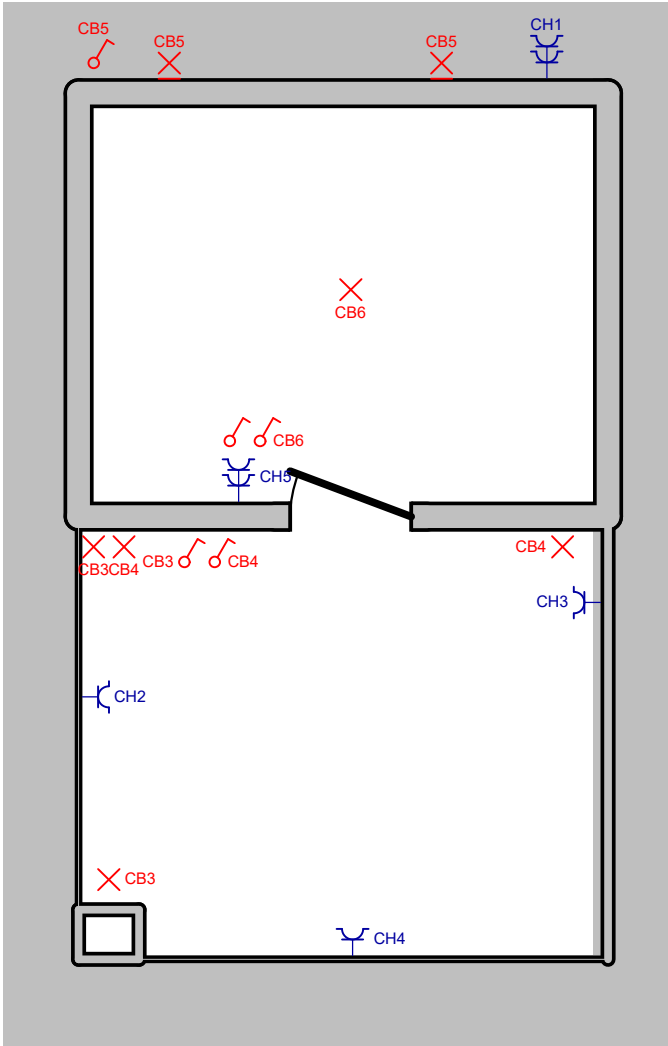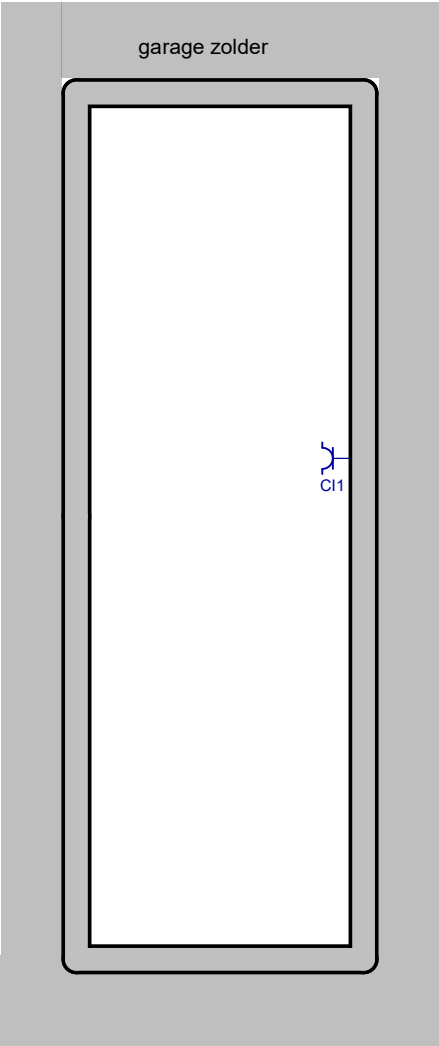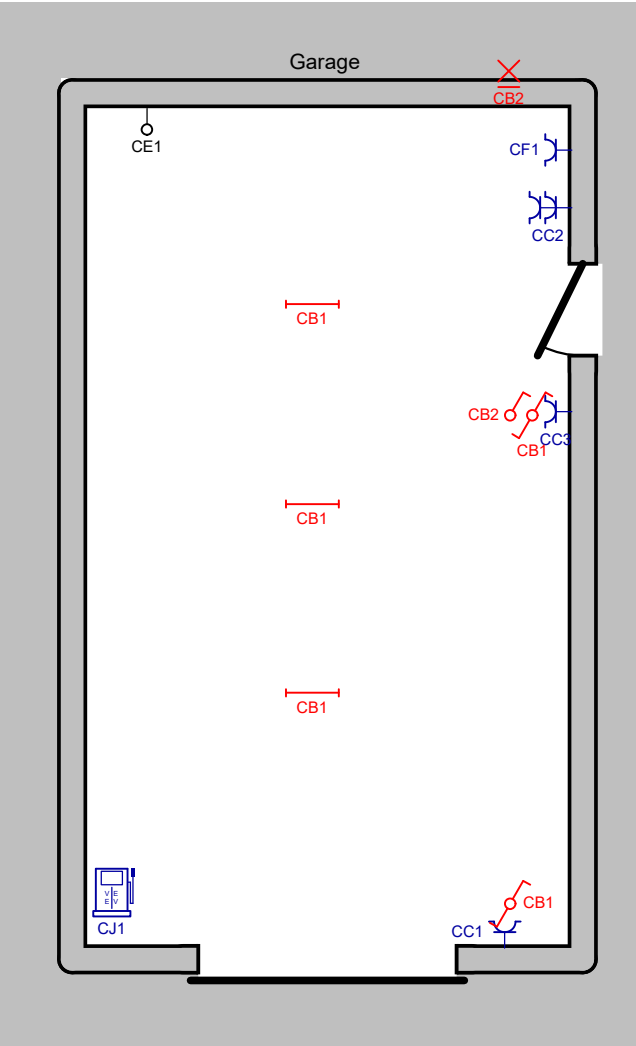

**Erkend Organisme**  
Atlas Contrôle asbl  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Scharbeek  
Tel.: 02 726 64 04  
e-mail: info@atlascontrole.be  
BE 0732.536.476

Atlas Contrôle VZW · BELAC 663-INSP · Peter D'hooge  
Installatie: Dendermondse Steenweg 4, 9080 Lochristi

**Plaats van de elektrische installatie**  
De Baere - Temmerman  
Dendermondse Steenweg 4  
9080 Lochristi

**Installateur**  
VDK Keurgroep  
Forelstraat 5  
8020 Oostkamp



**p. 5/6**  
**Situatieplan**  
3 x 400V + N ~ 50Hz

Geviseerd door de inspecteur · 14/09/2026

**Schema's getekend door: Plan-J - BE0803849985**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>A</b>  |                             |
| <b>B</b>  | Reserve                     |
| <b>C</b>  |                             |
| <b>D</b>  |                             |
| <b>E</b>  |                             |
| <b>F</b>  | reserve                     |
| <b>G</b>  | Voeding                     |
| <b>H</b>  |                             |
| <b>AO</b> | Hoofdschakelaar bord 2      |
| <b>AA</b> | Kookplaat                   |
| <b>AB</b> | Verlichting                 |
| <b>AC</b> | Alarm                       |
| <b>AD</b> | Microgolf                   |
| <b>AE</b> | Stopcontact eiland + keuken |
| <b>AF</b> | Frigo                       |
| <b>AG</b> | TV living                   |
| <b>AH</b> | Stopcontacten slaapkamer    |
| <b>AI</b> | Wasmachine                  |
| <b>AJ</b> | Droogkast                   |
| <b>AK</b> | Stopcontact badkamer + gang |
| <b>AL</b> | Doucheruimte                |
| <b>AM</b> | Vaatwas                     |

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| <b>AN</b> | Stopcontact aan kast                                  |
| <b>AP</b> | Garage                                                |
| <b>CA</b> |                                                       |
| <b>CB</b> | Verlichting tuin astroklok                            |
| <b>CC</b> | Stopcontacten/verlichting garage                      |
| <b>CD</b> | Hekken                                                |
| <b>CE</b> | Verwarming                                            |
| <b>CF</b> | Waterpomp                                             |
| <b>CG</b> | Poort                                                 |
| <b>CH</b> | Stopcontacten tuin/serre                              |
| <b>CI</b> | Stopcontact garage zolder                             |
| <b>CJ</b> | Laadpaal                                              |
| <b>AQ</b> | Omvormer                                              |
| <b>AR</b> | Omvormer                                              |
| <b>AS</b> | Boiler                                                |
| <b>AT</b> | Verlichting astroklok                                 |
| <b>AU</b> | Verlichting dimmers berging / dressing / slaapkamer 2 |
| <b>AV</b> | Videofoon                                             |
| <b>AW</b> | Stopcontact slaapkamer berging / keuken               |
| <b>AX</b> | Frigo diepvries                                       |

**Erkend Organisme**  
Atlas Contrôle asbl  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Scharbeek  
Tel.: 02 726 64 04  
e-mail: info@atlascontrole.be  
BE 0732.536.476  
Atlas Contrôle VZW · BELAC 663-INSP · Peter D'hooge  
Installatie: Dendermondse Steenweg 4, 9080 Lochristi

**Plaats van de elektrische installatie**  
De Baere - Temmerman  
Dendermondse Steenweg 4  
9080 Lochristi

**Installateur**  
VDK Keurgroep  
Forelstraat 5  
8020 Oostkamp



**p. 6/6**  
**Lijst Kringen**  
3 x 400V + N ~ 50Hz

Geviseerd door de inspecteur · 14/09/2026
