

DOSSIER ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EIGENAAR

G&B BV

Datum: 10/06/2026

August Van Bockxstaelestraat 53

9050 Gent

AANNEMER

IM ELECTRIC

Datum: 10/06/2026

Keizersdreef 6

9940 Evergem

BE1028335602

+32472981918

info@imelectric.be

KEURING

Datum: __/__/2026

,

Bijlagen....

EAN code:

Handtekening/Stempel

DOSSIER

SITUATIE-SCHEMA paginas:

4

EEN-DRAAD-SCHEMA paginas:

4

INSTALLATIE GEGEVENS paginas:

1

MATERIAAL LIJST paginas:


1

ZEKERINGKAST MARKERINGEN paginas:


2


Software naam


Kelder

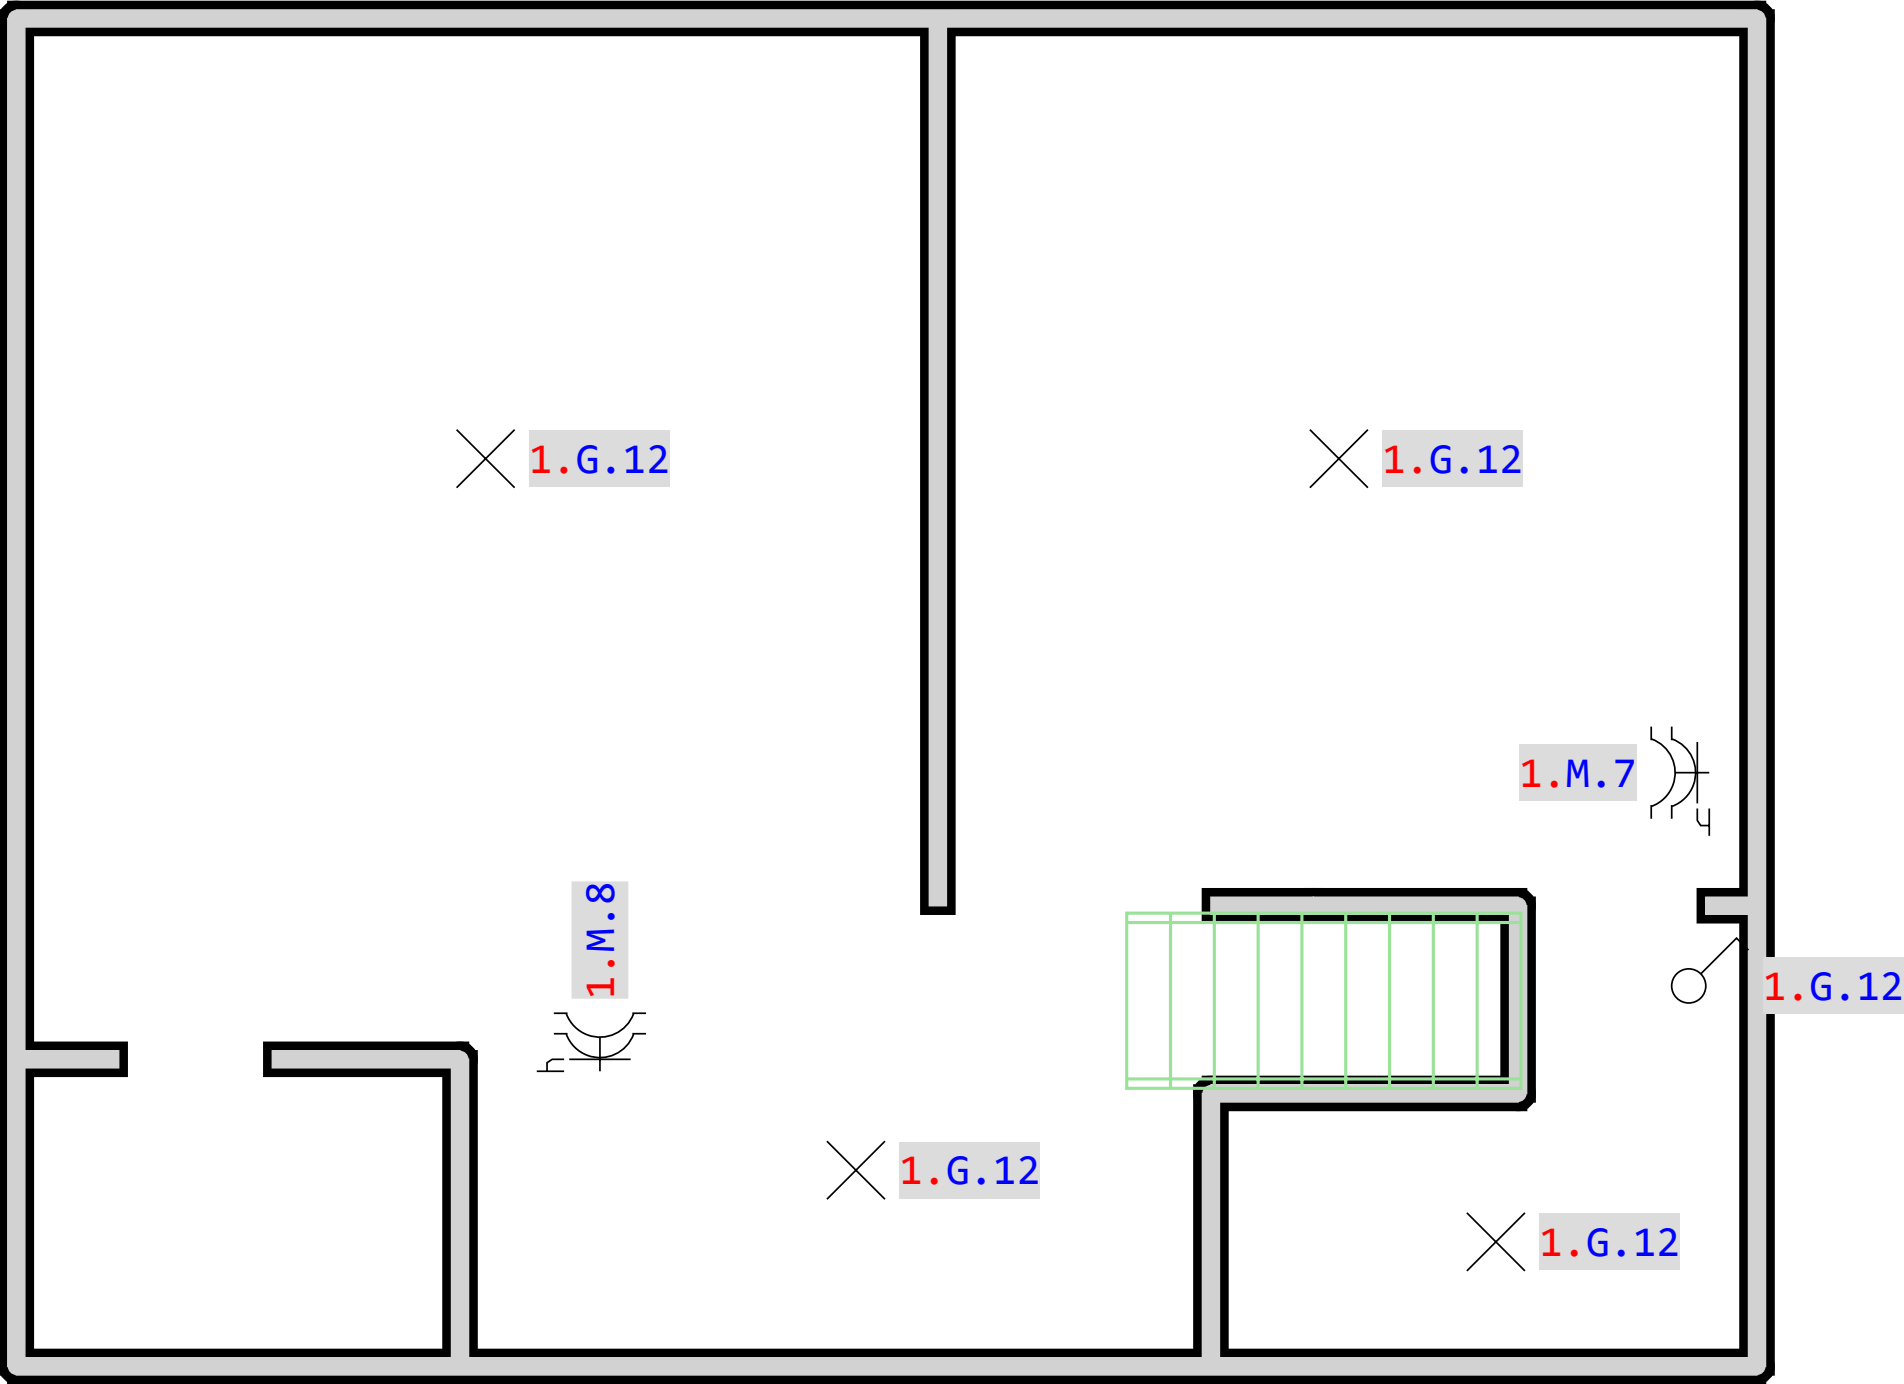



Zolder

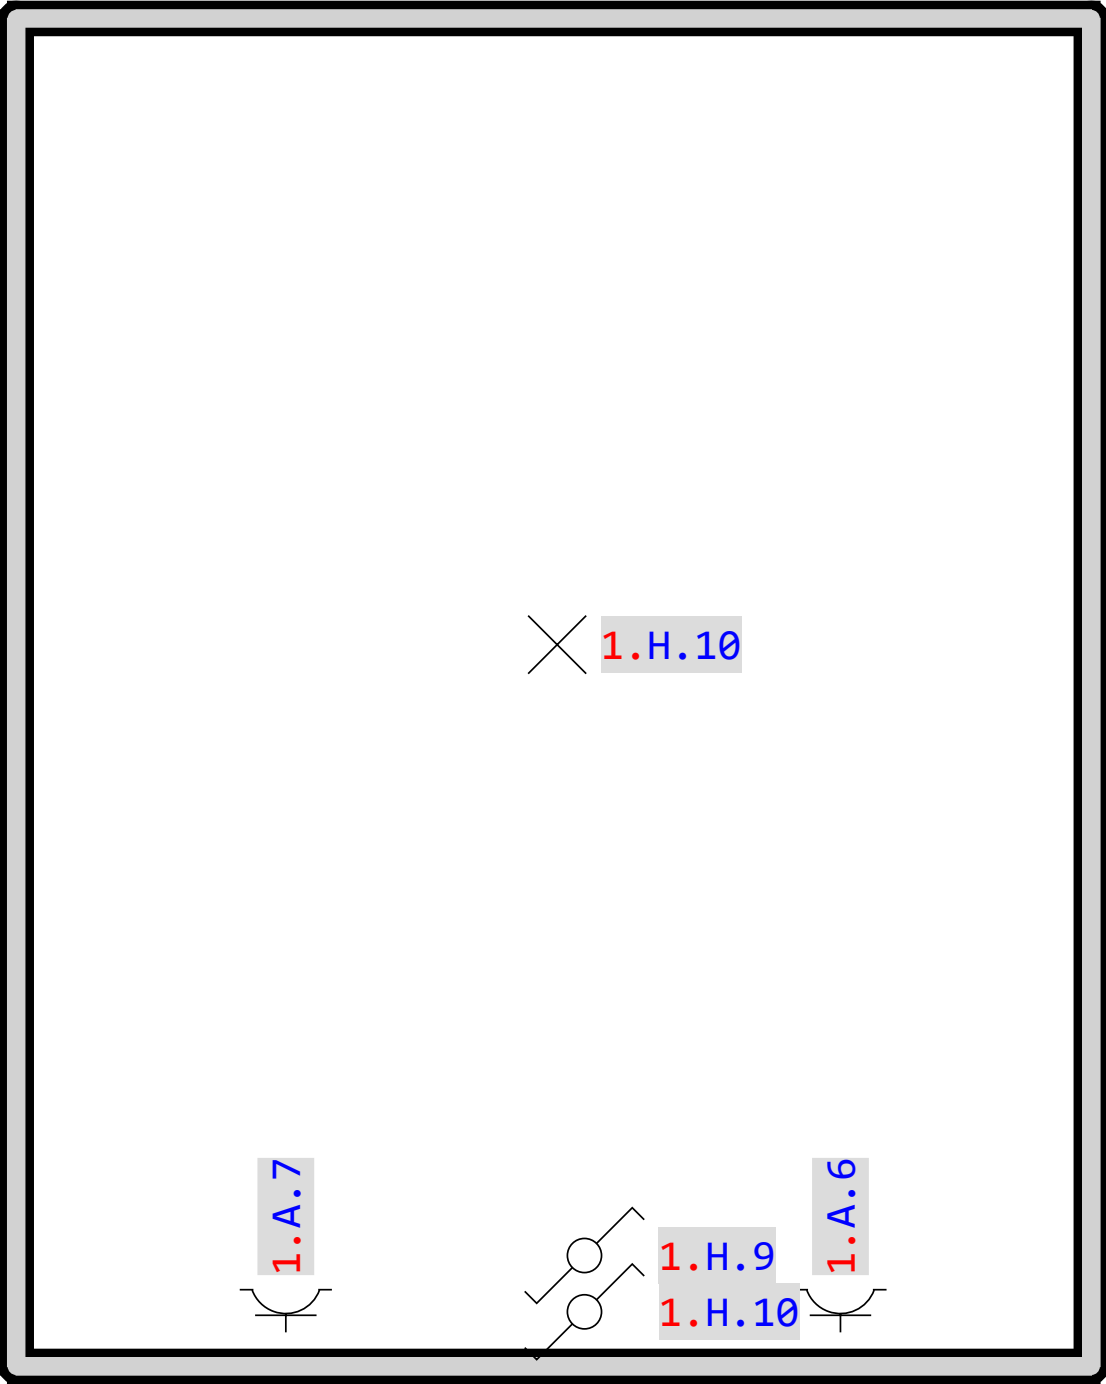


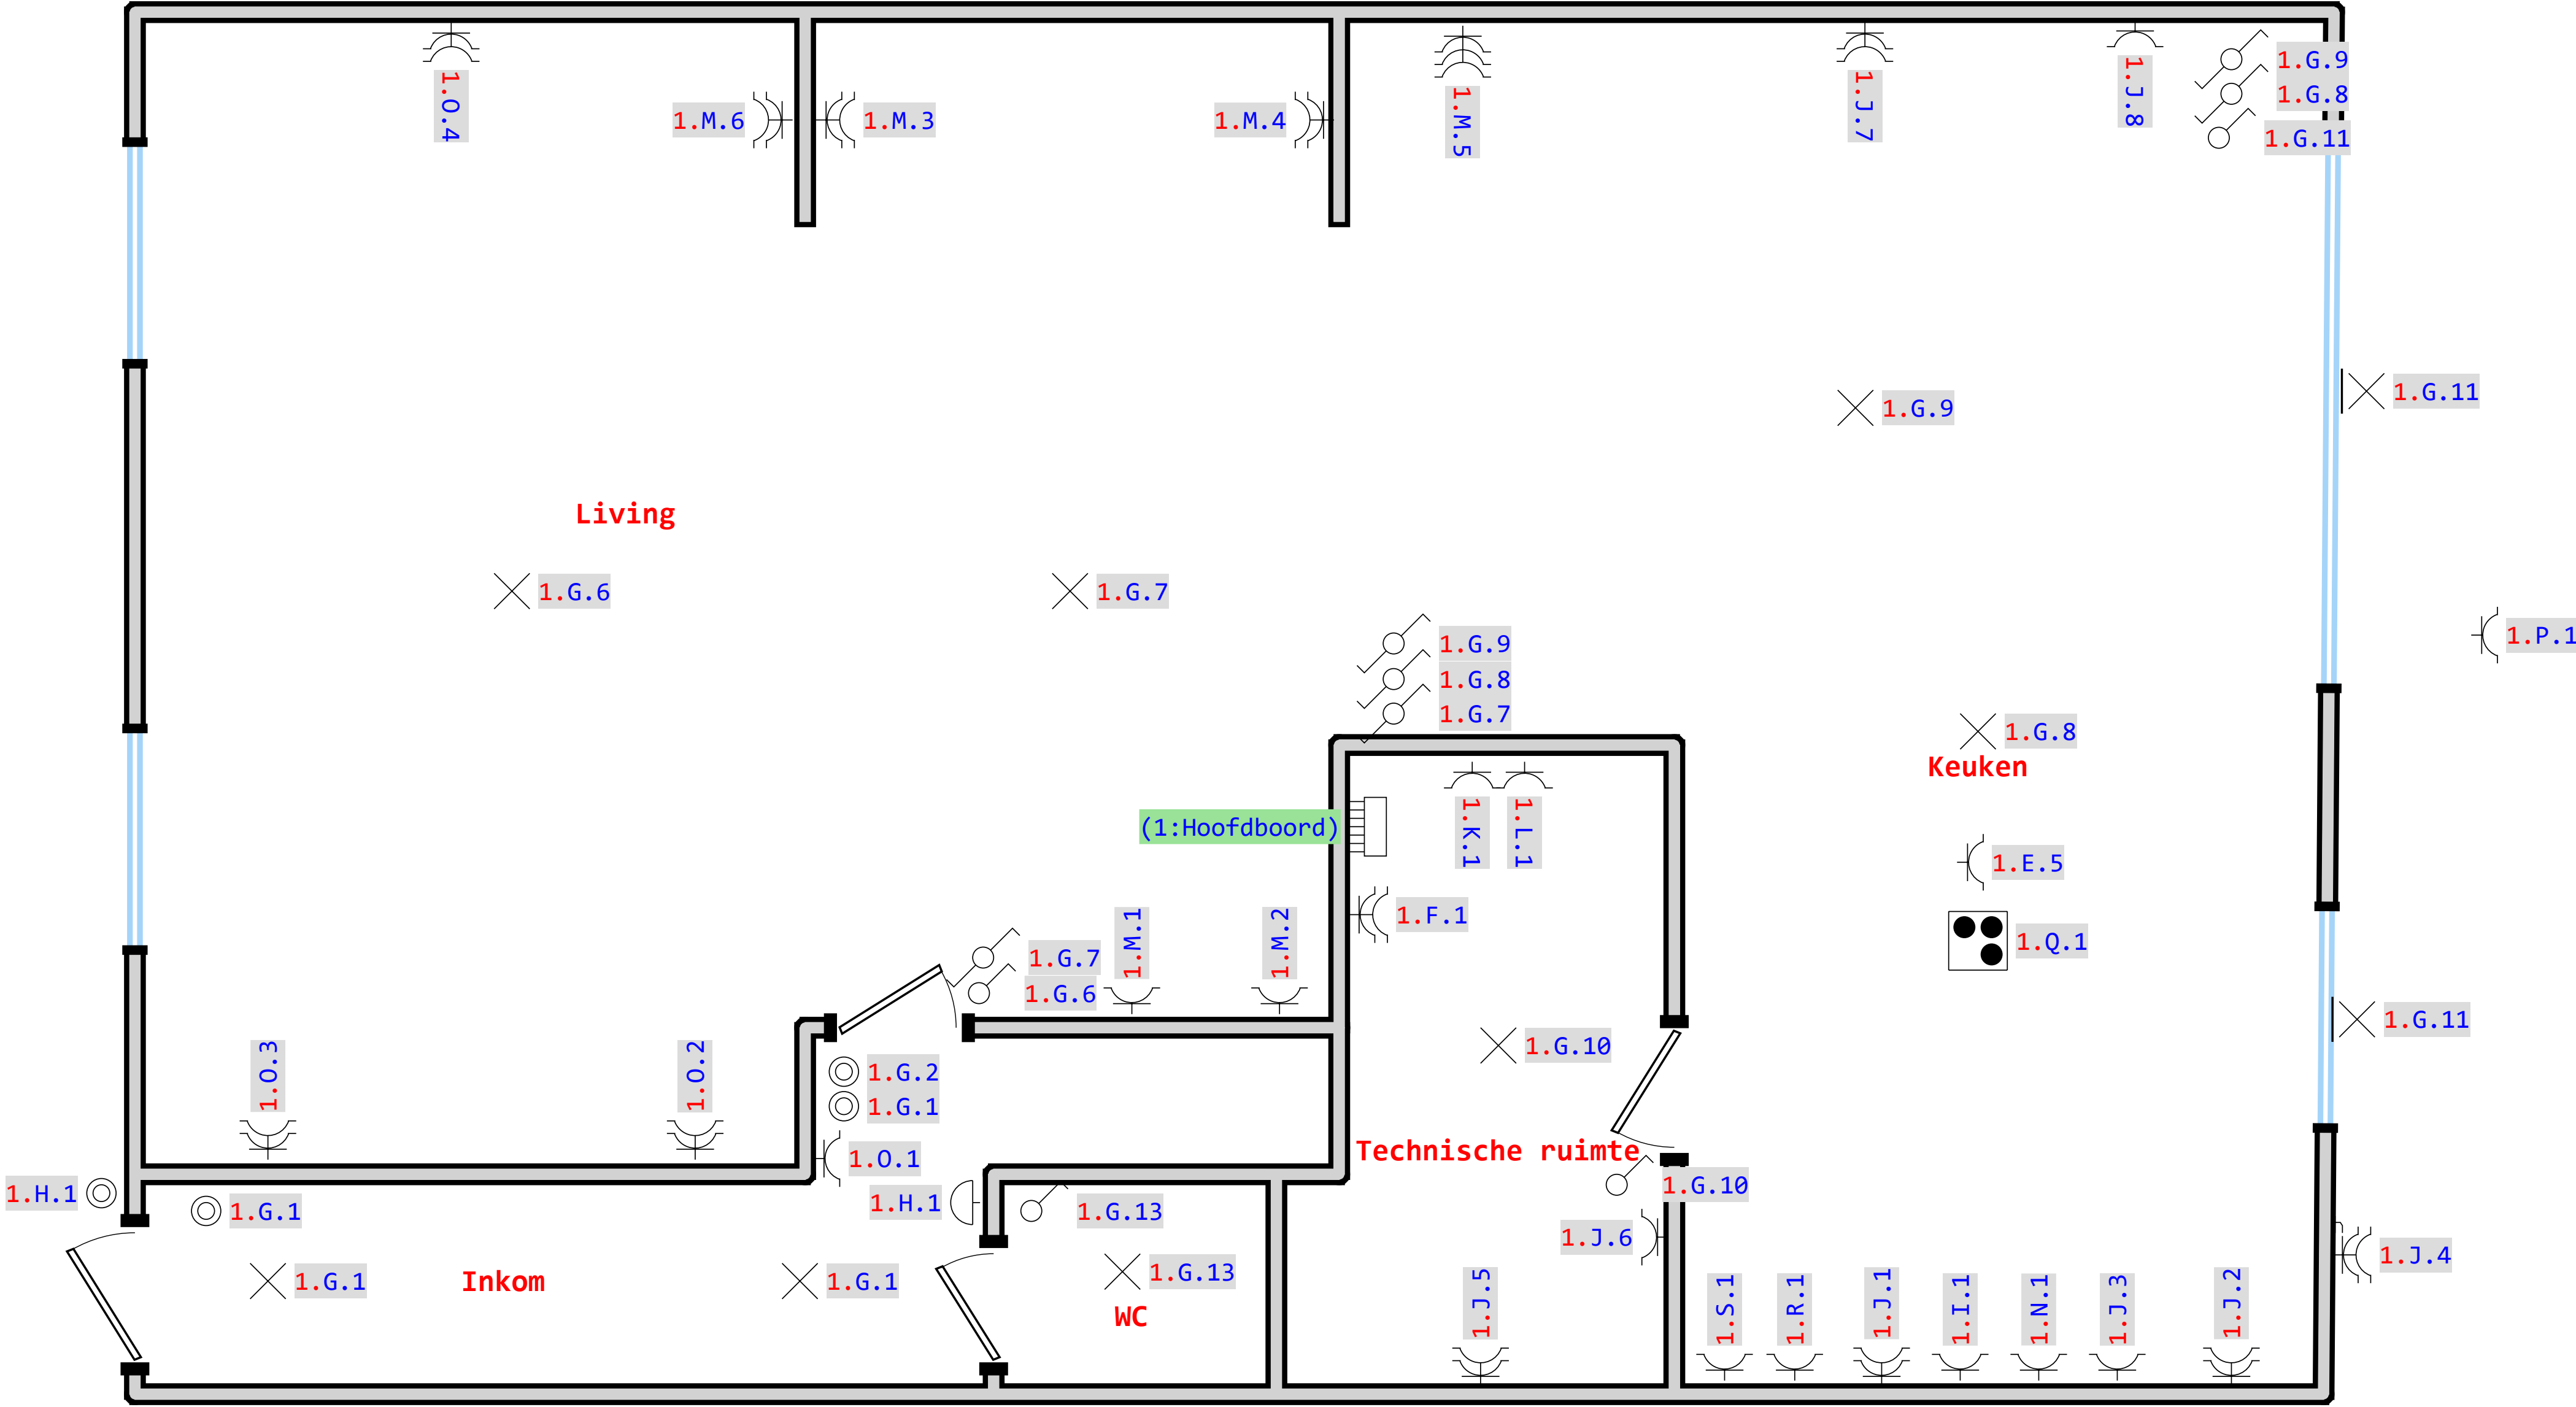


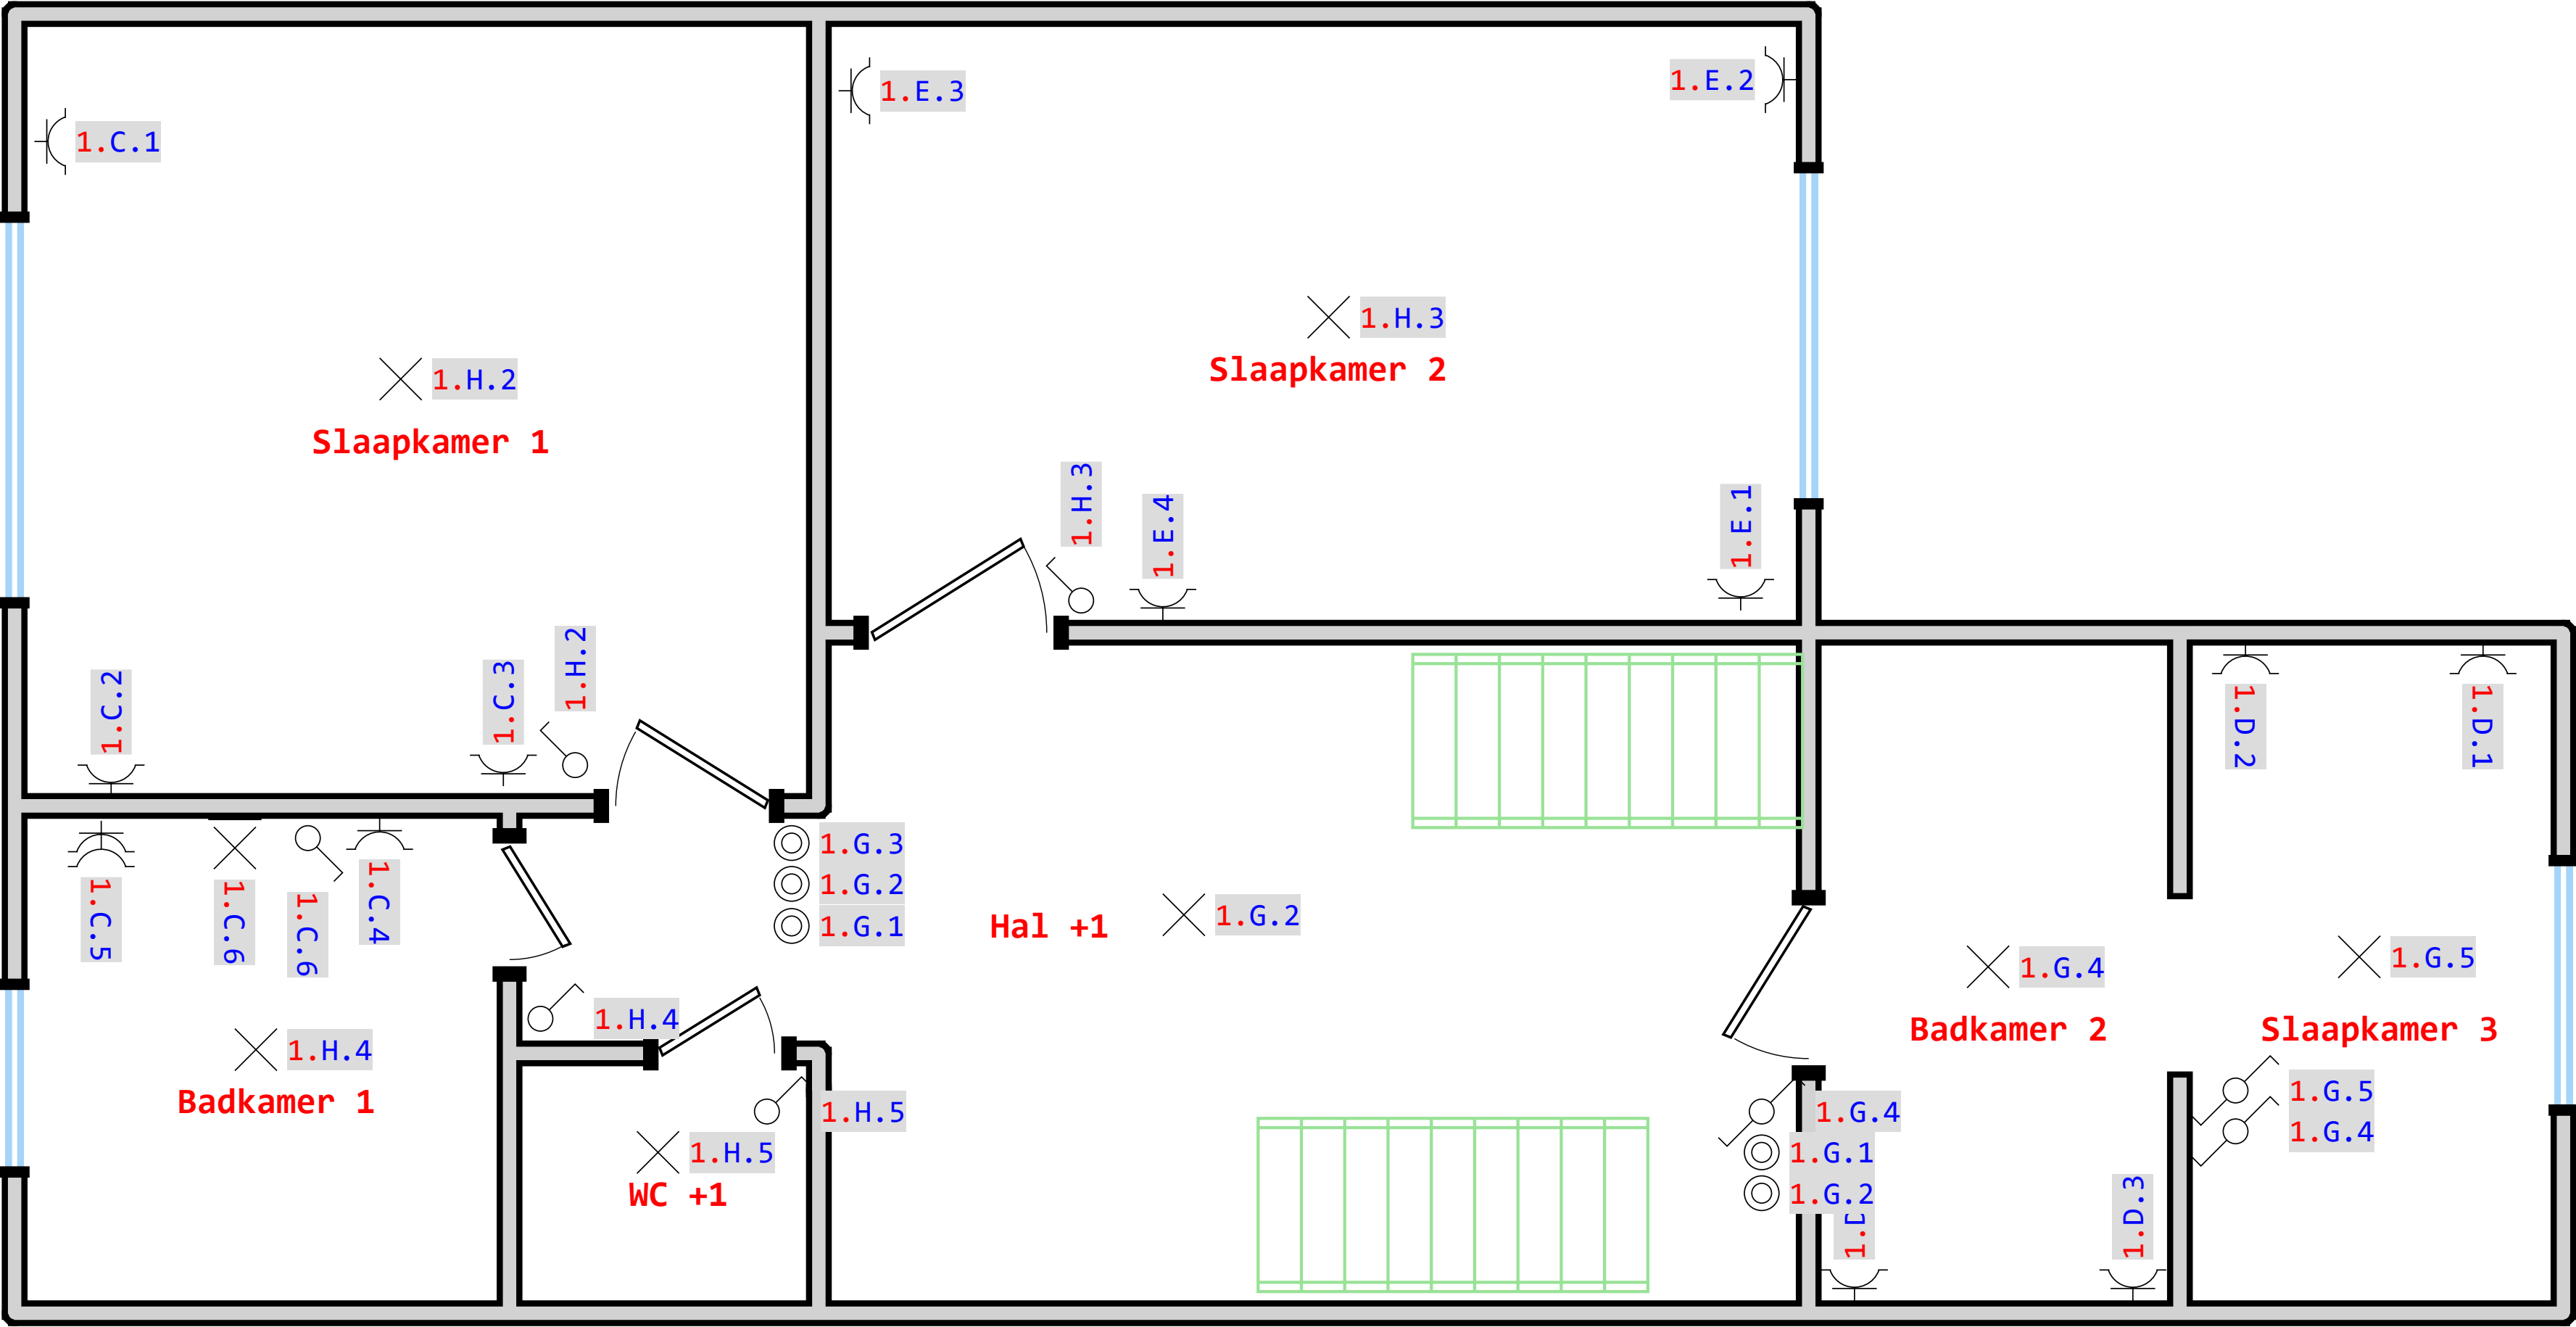


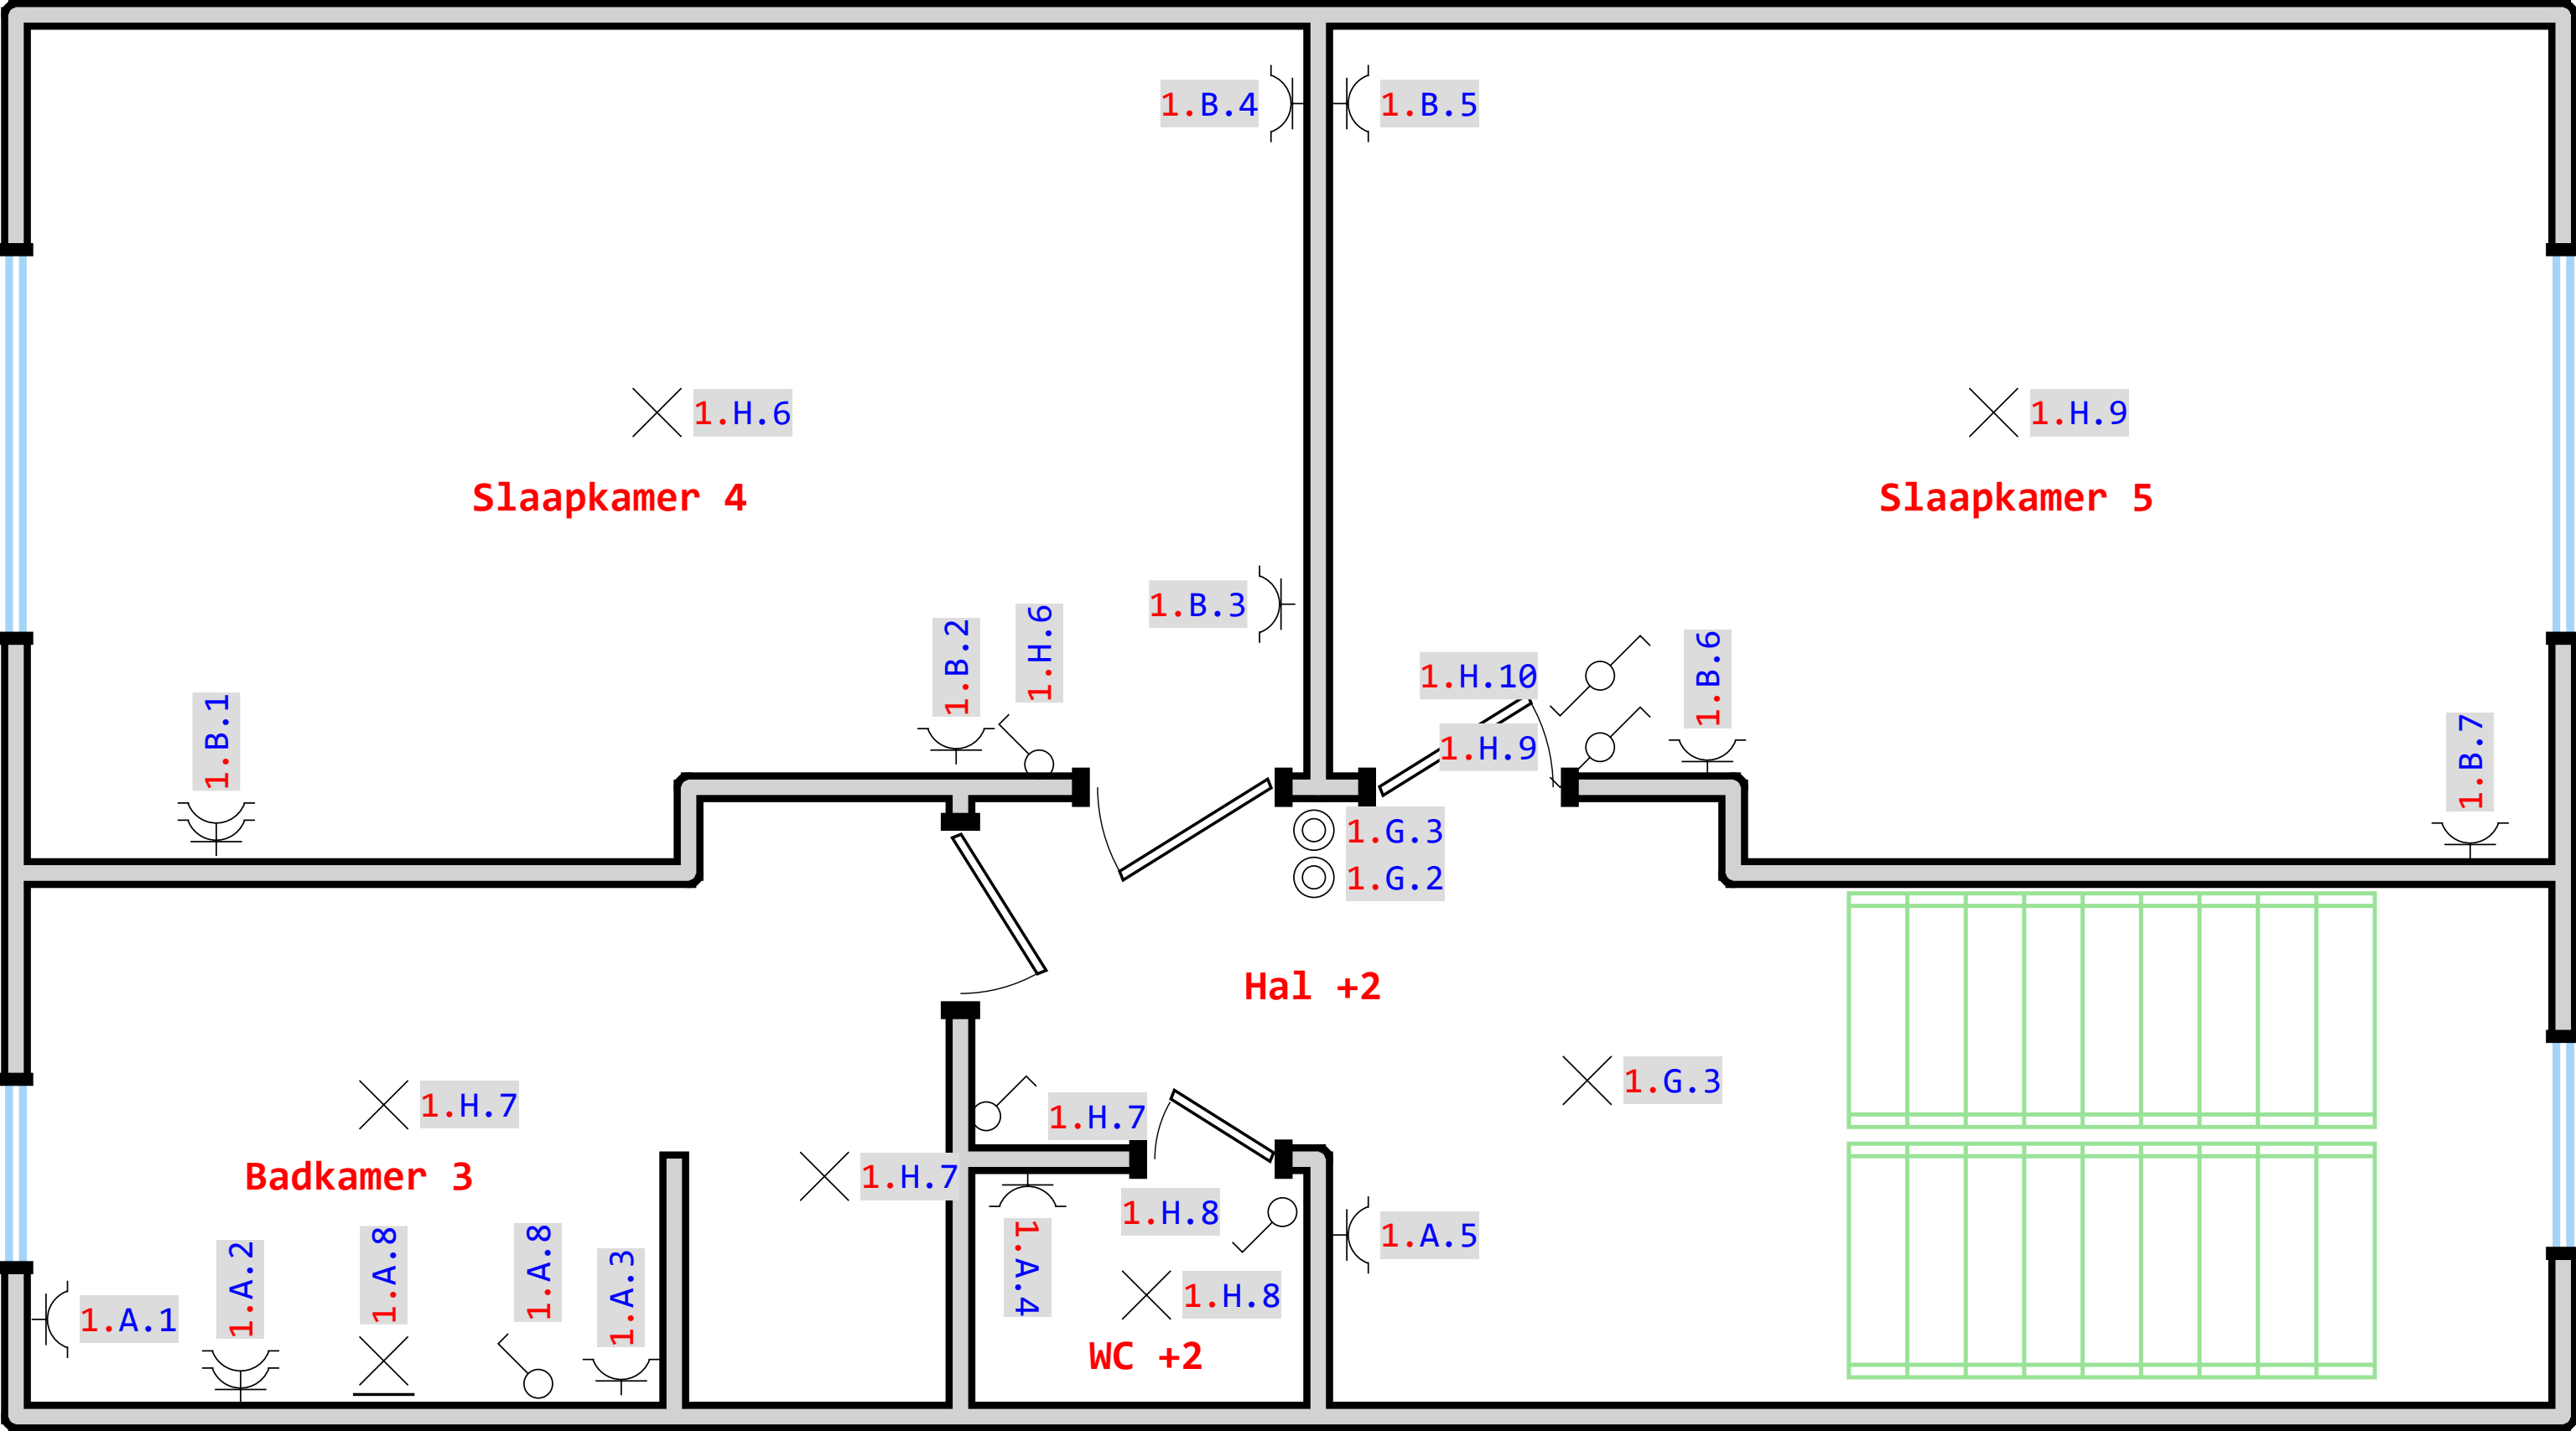

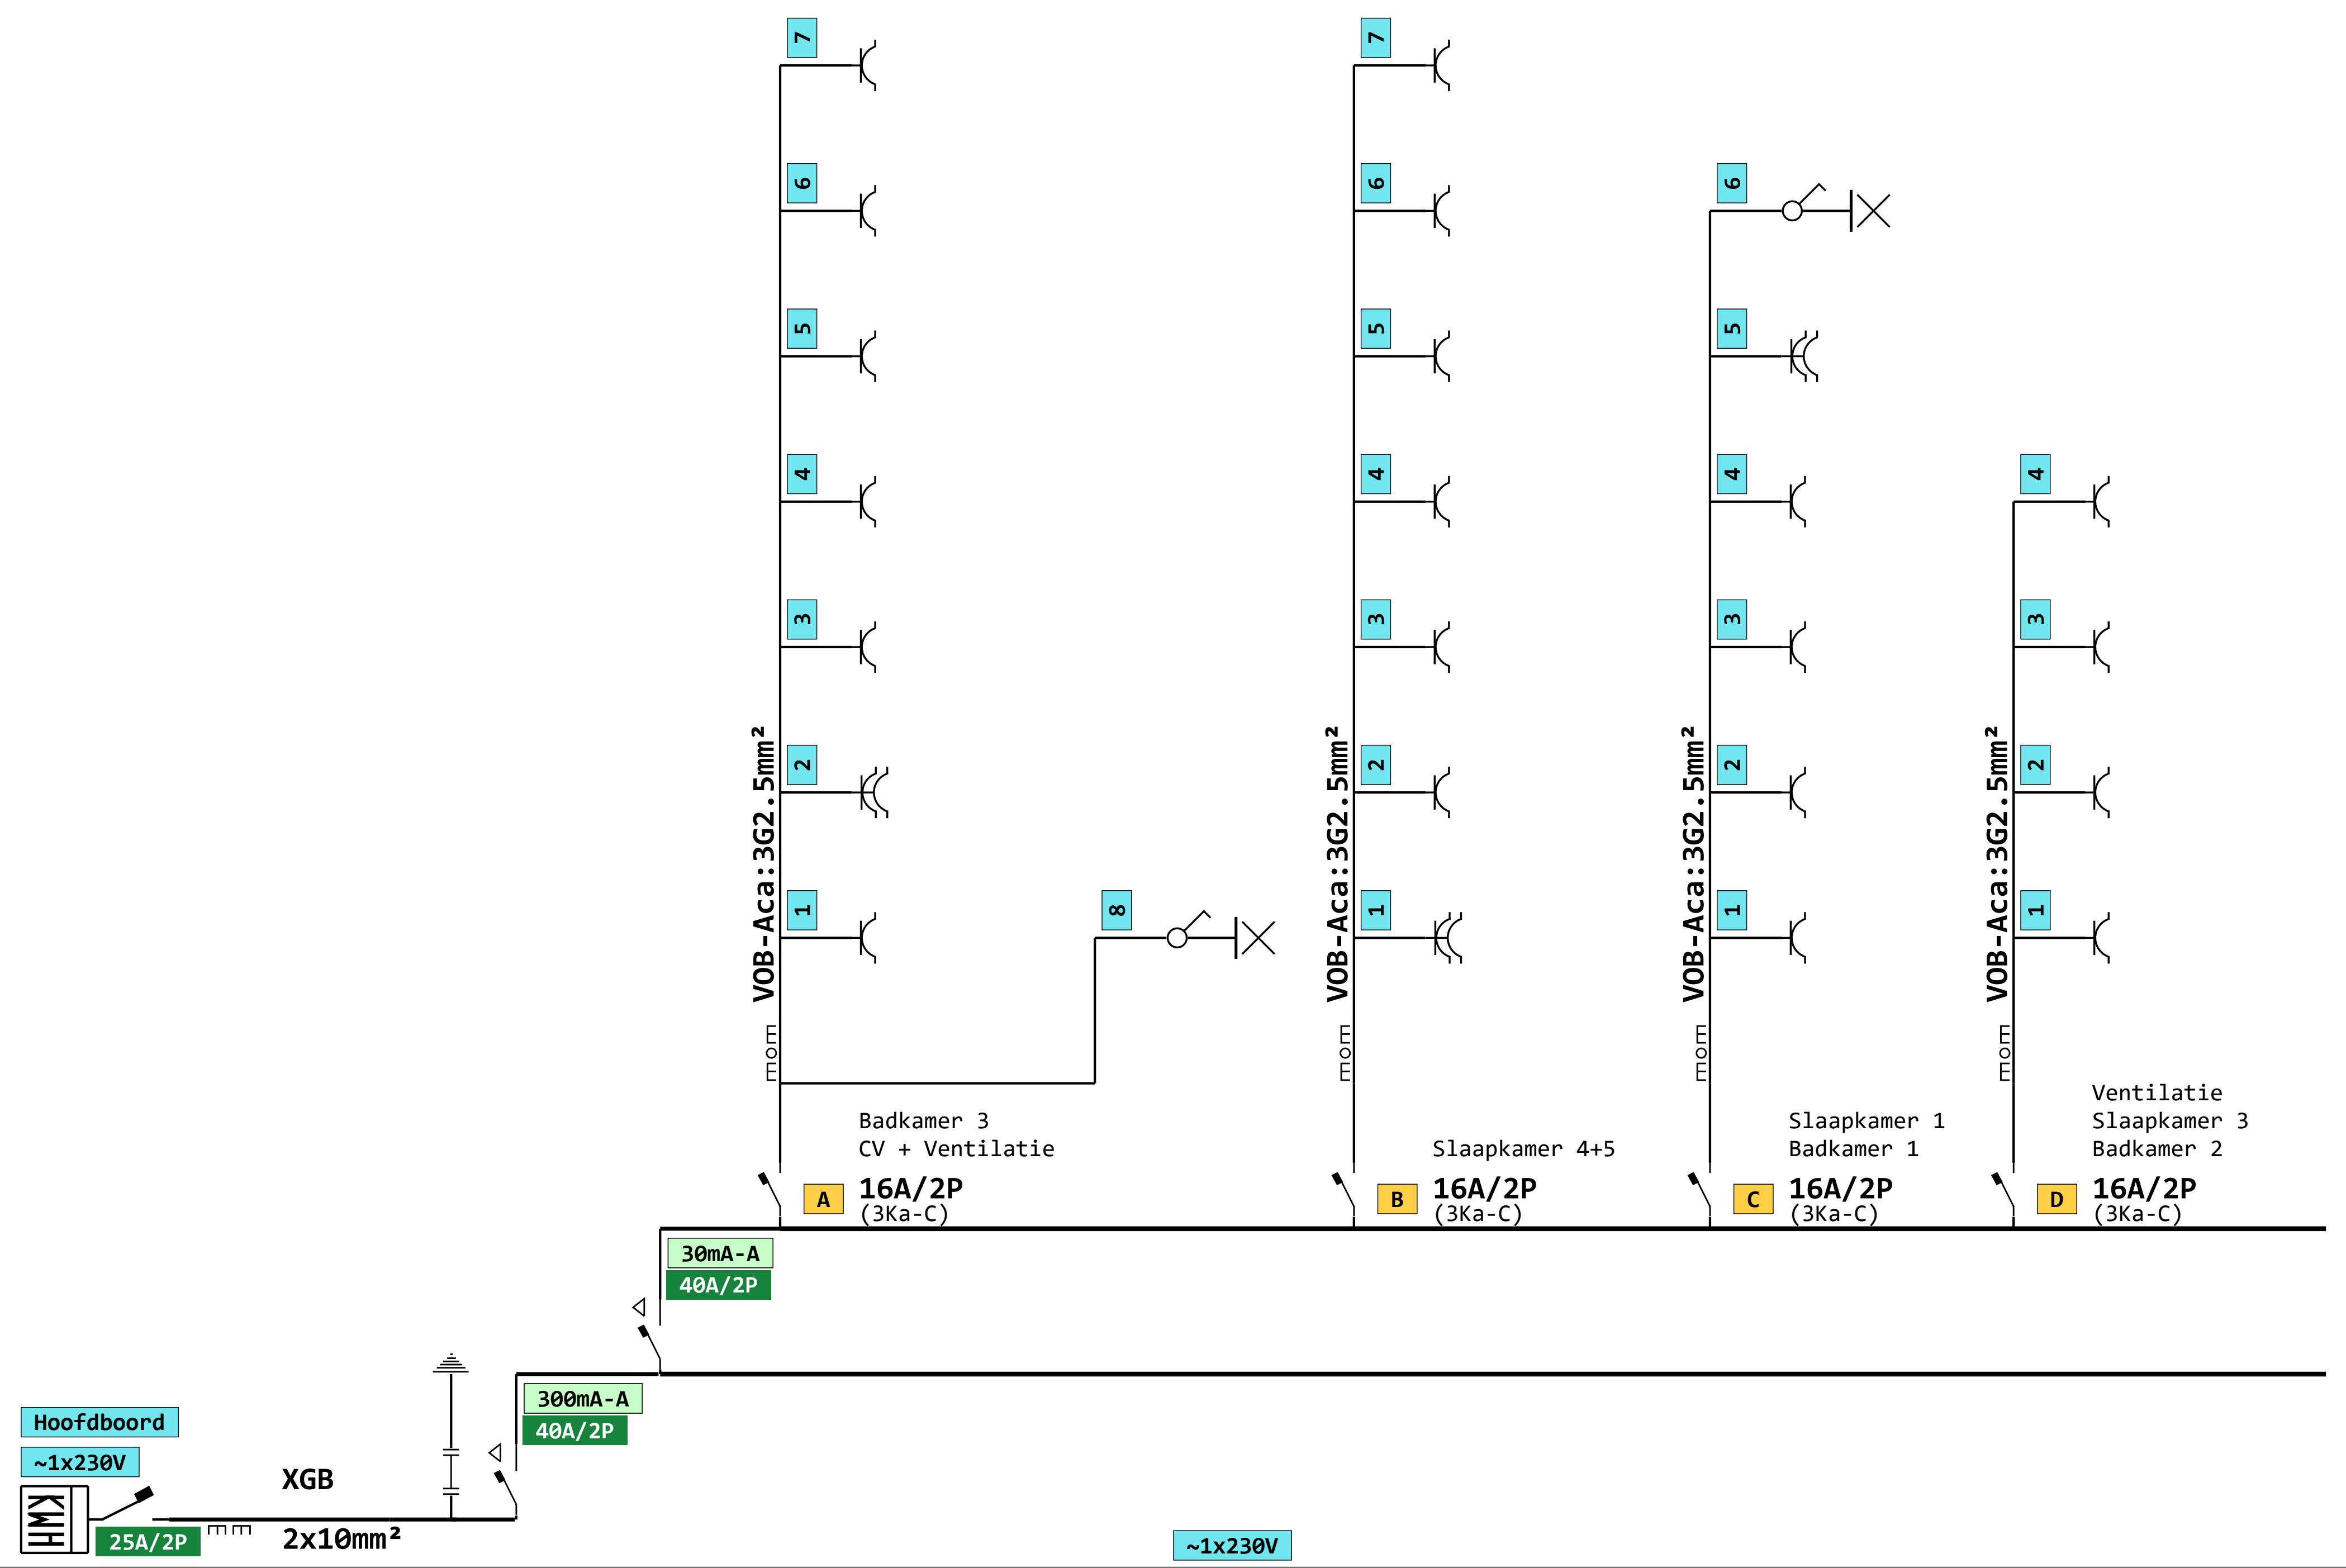

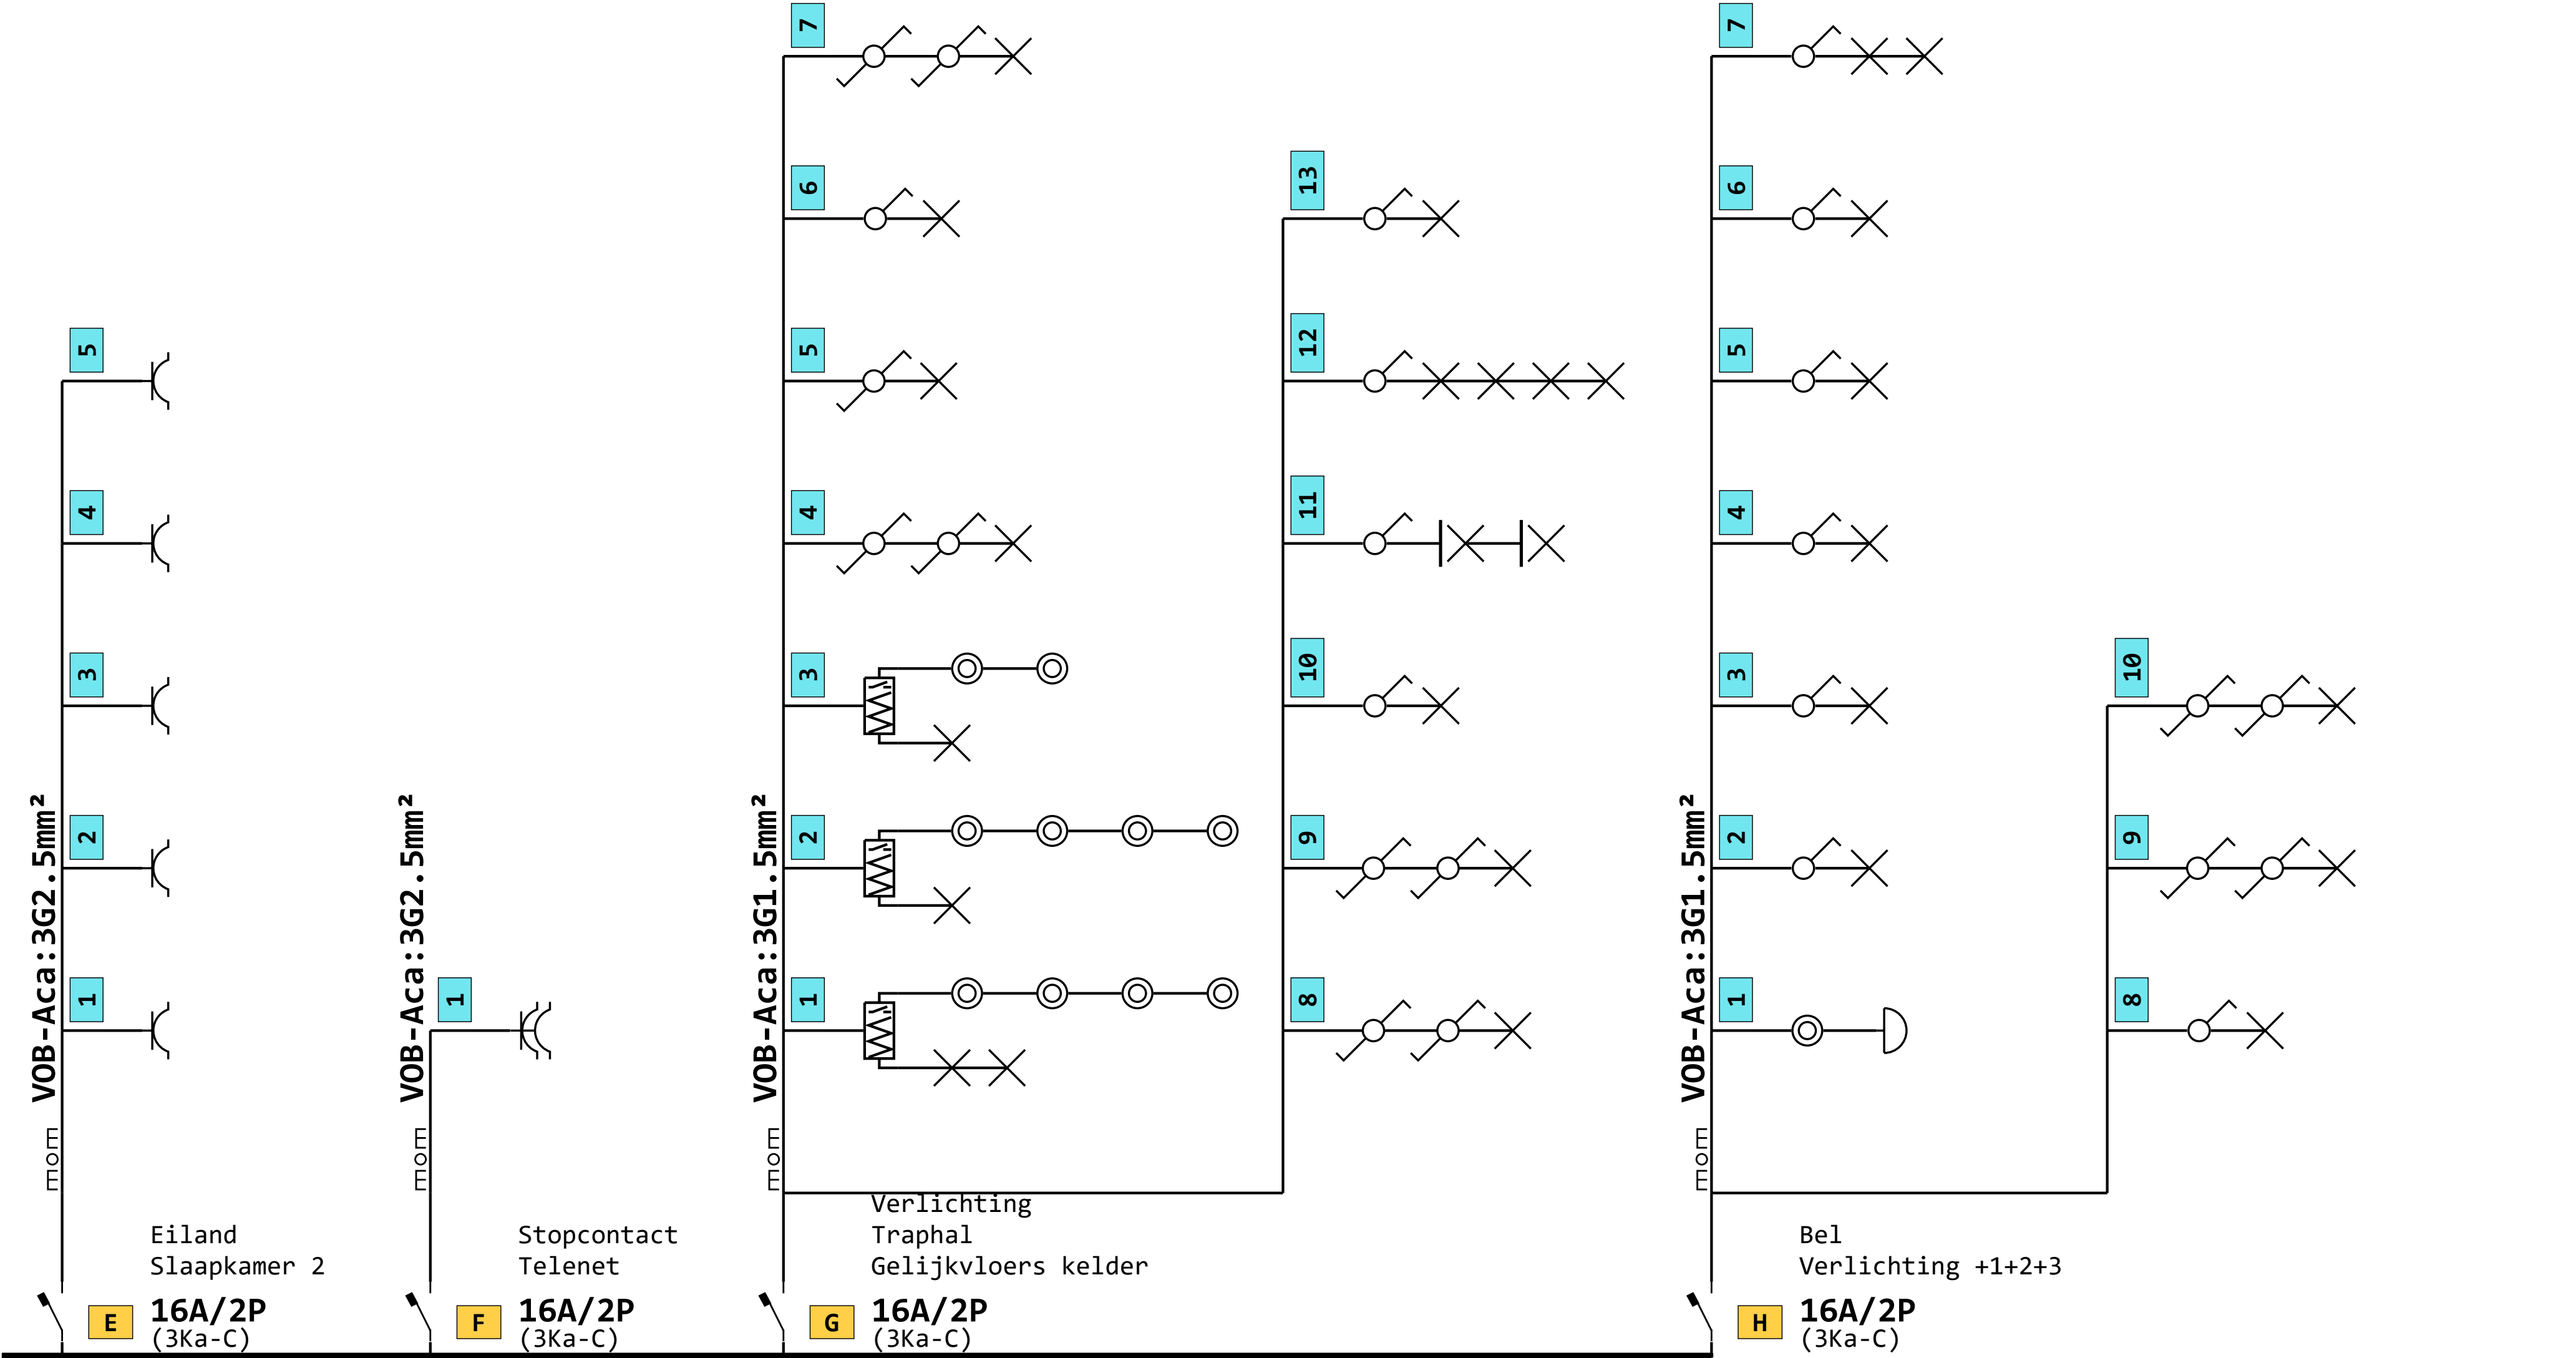

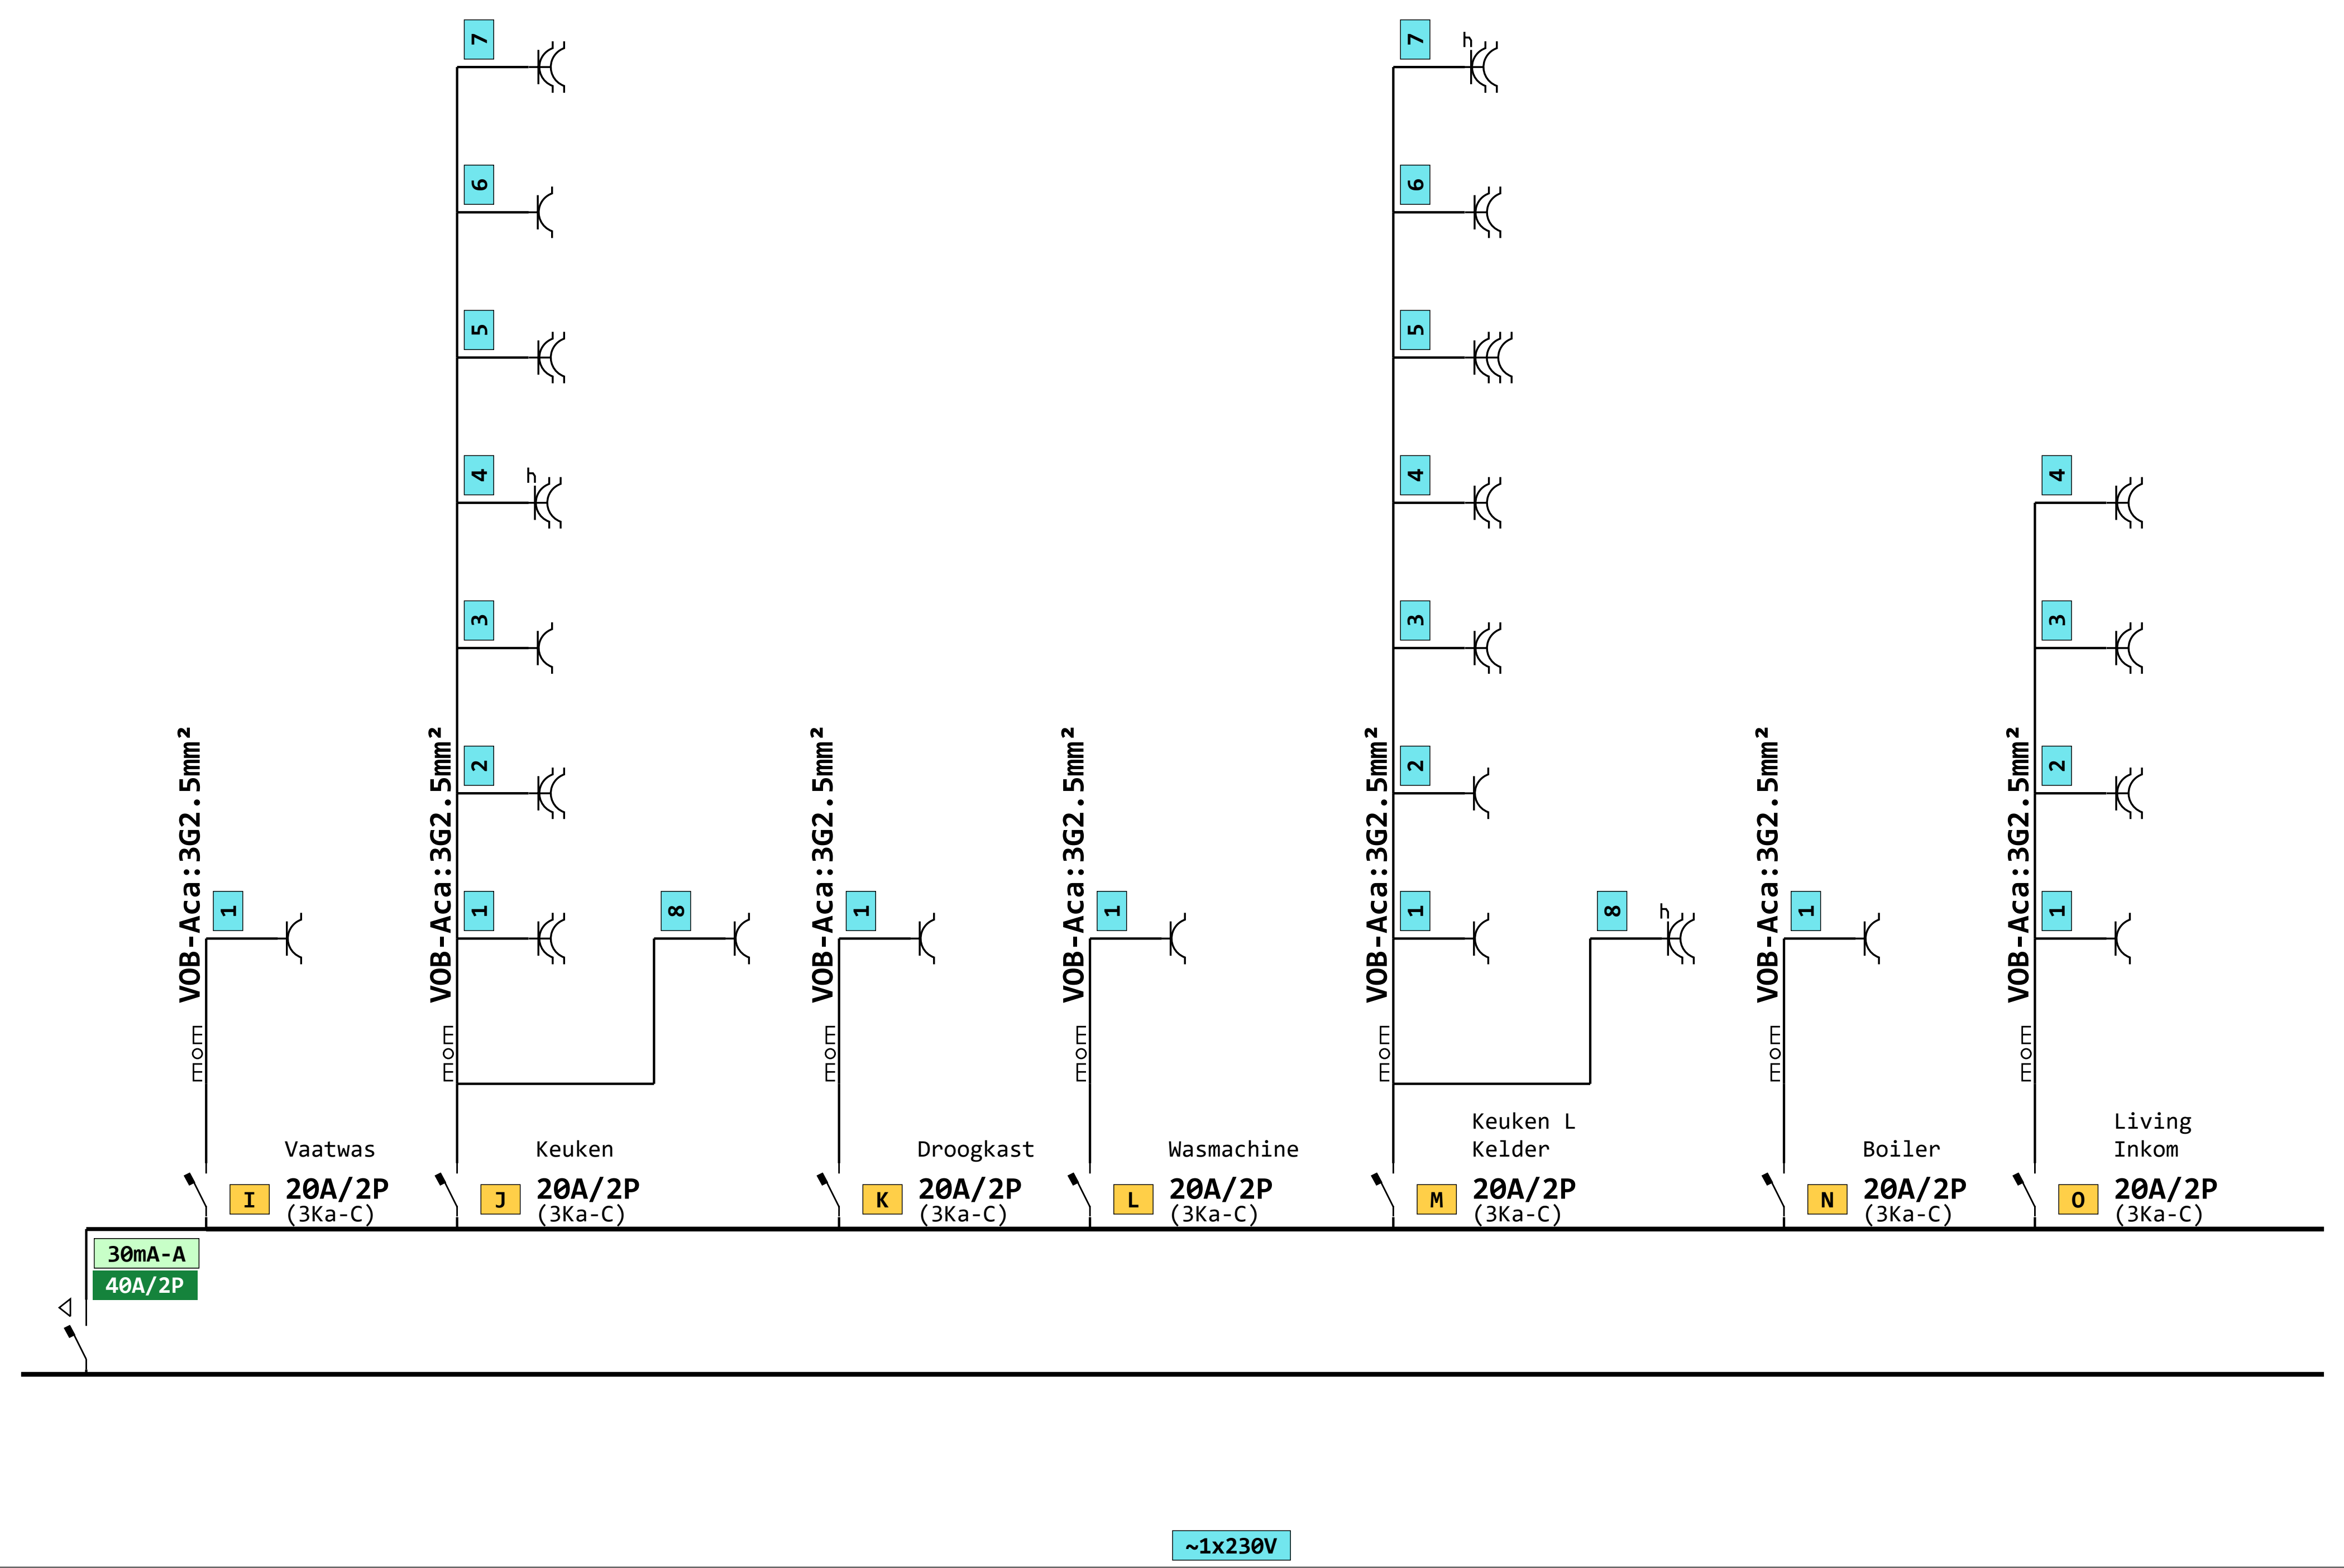

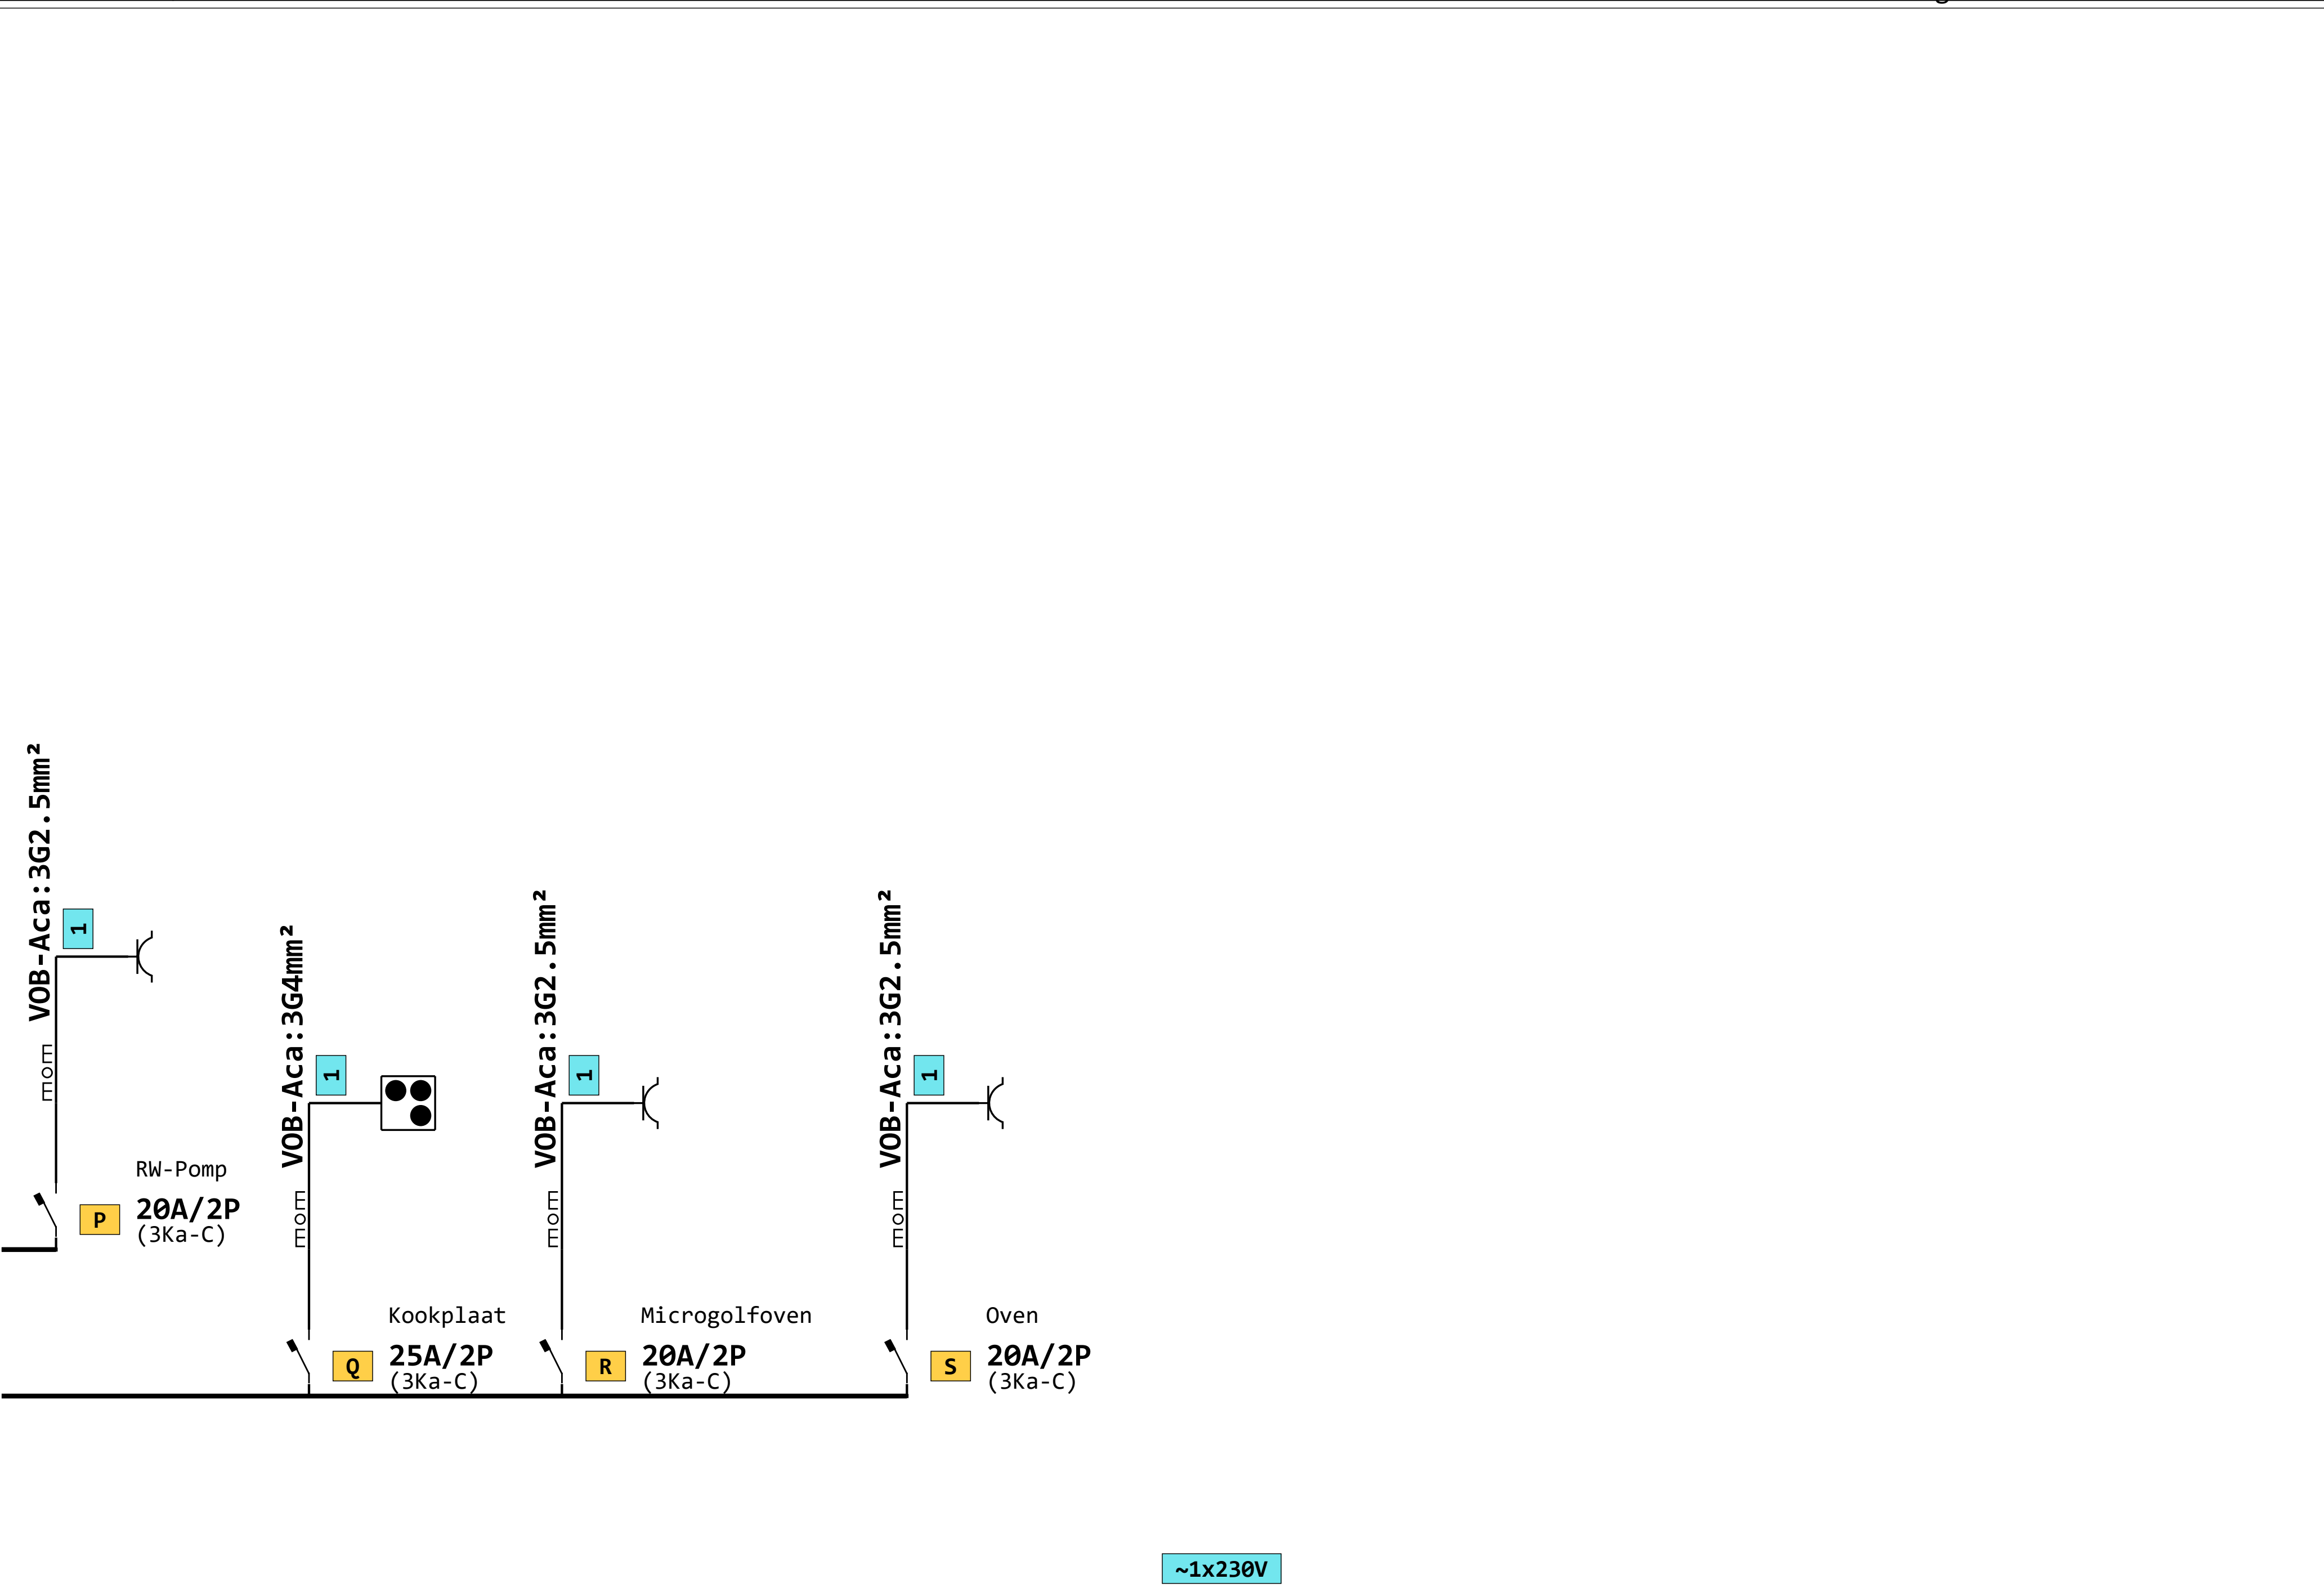

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/06/2026

Inspecteur: Michel Mergan

Mentor:

Installateur: IM electric

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0890 117 926

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481286

Datum verslag: 11/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam August Van Bockxstaelestraat
Huisnummer 53
Busnummer
Postcode 9050
Gemeente Gentbrugge
Land België

Eigenaar

Naam Gb bv
Straatnaam August Van Bockxstaelestraat
Huisnummer 53
Busnummer
Postcode 9050
Gemeente Gentbrugge
Land België

Installateur

Naam IM electric
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type :

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820043505966

Teller Nr. : 1SAG3200464182



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 19

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 587 MΩ

RE: 14.09 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40	I-P	22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40	A-H	22,5kA2s (3000A)	A	8	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	OK		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N13 De ruimte die een bad en/of douche bevat (zoals bedoeld in hoofdstuk 7.1. van het AREI, Boek 1), was nog niet (volledig) afgewerkt. Wij konden ons bijgevolg niet uitspreken over de conformiteit van de elektrische installatie in deze ruimte. Een bijkomende gelijkvormigheidscontrole van deze installatie is nodig en dient aangevraagd te worden door de eigenaar, beheerder of uitbater na afwerking en vóór de ingebruikname van deze installatie.
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N38 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/6/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 13

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:20 tot 10:35

De inspecteur Michel Mergan

Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/6/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



