



VINÇOTTE CERTIGO vzw  
 Erkend Controleorganisme  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: GEN/19170108402

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
  - Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde
  - Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
  - Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
- Tel: +32 9 244 77 11    gent@vincotte.be  
 Tel: +32 2 674 57 11    brussels@vincotte.be  
 Tel: +32 3 221 86 11    antwerpen@vincotte.be  
 Tel: +32 81 432 611    gembloux@vincotte.be

**BELAC** 442 INSP  
 CN 047153  
 Resi code: 1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie Eigenaaf of beheerder:

Naam, voornaam: Fca Solutions Dnb Naam, voornaam: Vander Steene Jean-Luc  
 Adres: Pieter van Reusschootlaan 12  
 Ident. Kaart nr.: ..... Post nr. + Stad: 9051 St-Denis-Westrem  
 BTW nr.: BE ..... Tel.: 1

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  Woonenheid / pv-installatie  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheid  
 Art 271  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  Gemeenschappelijke delen  
 Art 276: verzwinging  Art 276bis: verkoop van een wooneenheid  Art ...  Art .....  Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 60 943834  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: 70098 meterstand dag: 70098 nacht: 49640  kWh excl. nacht meter:  
 Bescherming aansluiting (A):  25  32  40  50  63  80  100  ..... nr.: ..... meterstand: .....

Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  230 V  3x230 V  3N400 V  ..... Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  aardingslus  pen / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> - Type: V0B  .....

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1  
 zie bijlage(n)  
149 panelen x 950 Wp  
Omvormer: Power One ABB 10/6 TL  
Green GST  
Pmax AC = 10 000 W (3N 120 995)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 2.5 Ω  Algemeen isolatieniveau: 1.1 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
 Differentieelstroominrichting:  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	/
Inbreuken Bestaande installatie	/
Opmerkingen	/

Visum DNB of aangestelde: .....

Besluit(en):  De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 17/05/2014  
 door hetzelfde erkend organisme (\*)

Agent bezoeker: Loeve Anthony Agent nr. 4034 Datum 17/05/2014  
 Bijlage(n):  Situatieschema(s): 1  Eendraadsschema(s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening [Signature]

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vervullen.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

0370010201

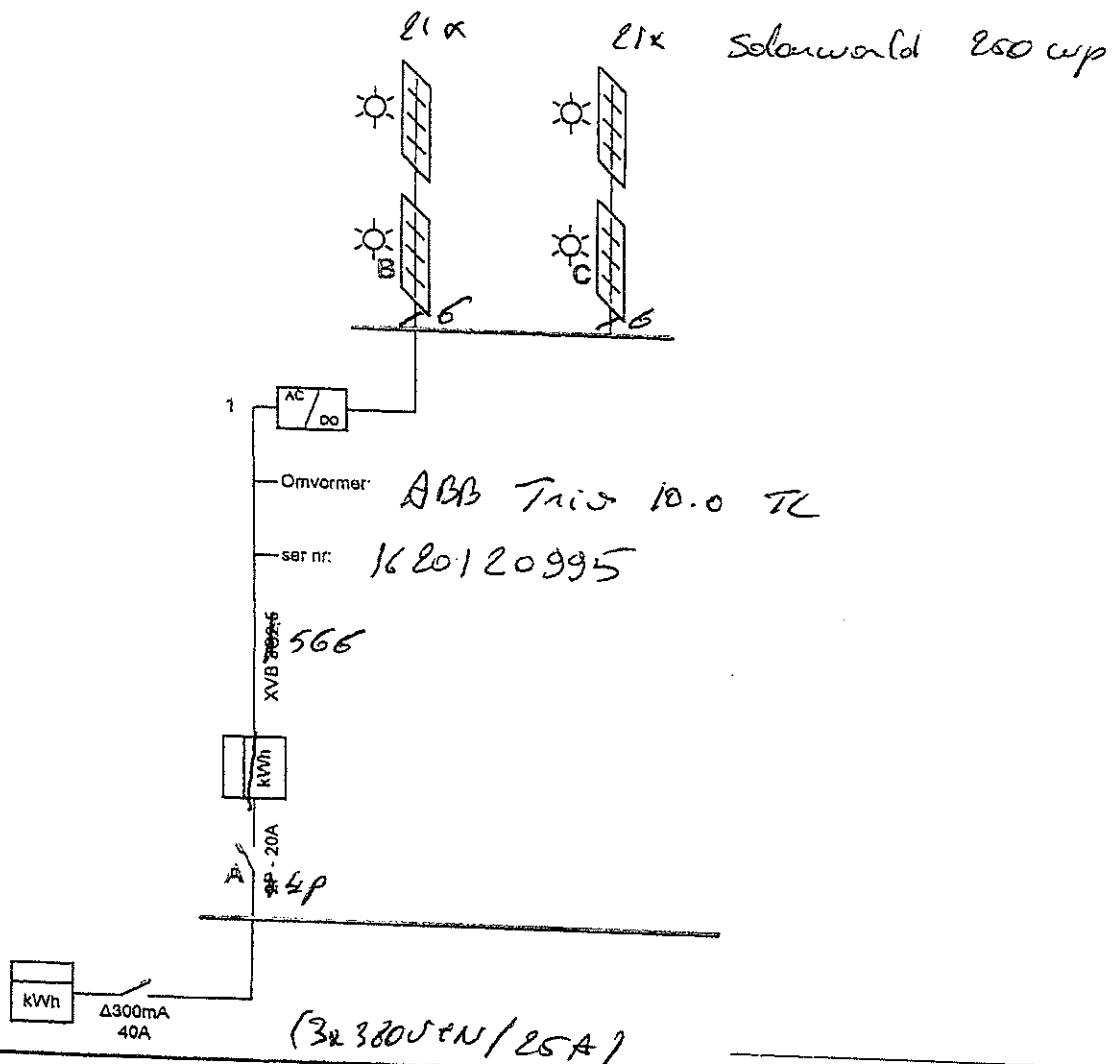

id Organisme Bus GSM: - e-mail: -	Plaats van de elektrische installatie <i>P. van rey schoedloon / sint          Denys werken</i> Tel.: GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Alfasun Bovenhoek 64 9406 Ninove(Outer) Tel.: / GSM: 0485 22 22 24 Fax: - e-mail: - 0810 424 805	p. 1/1 Eendraadschema 3 x 230V - 50Hz
--	---	--	---
