



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

30.610.071.85

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 397778

Resi code : 1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : <u>Huiskinderen</u>	Naam, voornaam : <u>George Rumbaut</u>	
Ident. Kaart nr. : <u>0750 622 325</u>	Adres : <u>9830 Sint-Martinus-laan</u>	
BTW nr. : <u>BE 0750 622 325</u>	Post nr. + Stad : <u>9830 Sint-Martinus-laan</u>	
	Tel. : <u>0750 622 325</u>	

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	☒ Wooneenheid	☐ Vóór 1/10/1981
☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	☐ Werkeenheid	☐ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
☐ Controlebezoek (6.5.)	☐ Werfinstallatie	☒ Vanaf 1/06/2020
☐ Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)	☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	☐ Technische lokalen van een residentieel geheel	
☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☐ Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8 : ☐ Toegepast ☐ Niet toegepast	☐ Andere installatie :	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	Gegevens installatie	Beschrijving installatie
Gegevens verdelers : EAN : <u>24392992</u>	Gegevens installatie : Ontworpen voor U _N : ☒ mono 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Beschrijving installatie : <u>125MA SB4.0-1AV-41 63 SN:3006244381</u>
Naam verd.: kWh meter nr. : <u>9367</u> meterstand dag : <u>83636</u>	Maximale nominale stroom (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	<u>16x Sunrise 350wp => 5600Wp totaal</u>
Bescherming aansluiting (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>V.0.B.</u>	<u>geen andere stroomkabel aanwezig</u>
Algemene differentieelstroominrichting : <u>63A</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>1</u>		
Type aardelektrode : ☐ Type aardingslus : ☒ open / baar Aardverbindingssyst.: ☒ TT ☐		
P _{Max} : <u>4000w</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Verplaatst materiaal	☒ Vast materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>11,7</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>1,62</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	☒ Test diff.		
Alg. diff. : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend : ☒ Ja ☐ Nee						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	
Nieuwe installatie	☒ Nihil
Vastgestelde inbreuken	
Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	<u>controle Rumbaut ebel PV-is</u>
☐ Nihil	

Besluit :

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker :

Naam : Sekys Agent nr. : 5439 Datum : 27/06/2021

Bijlage(n) : ☐ Situatieplan(nen) : 2 ☐ Eéndraadsschema('s) : 1 ☐


Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

21/06/2025

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

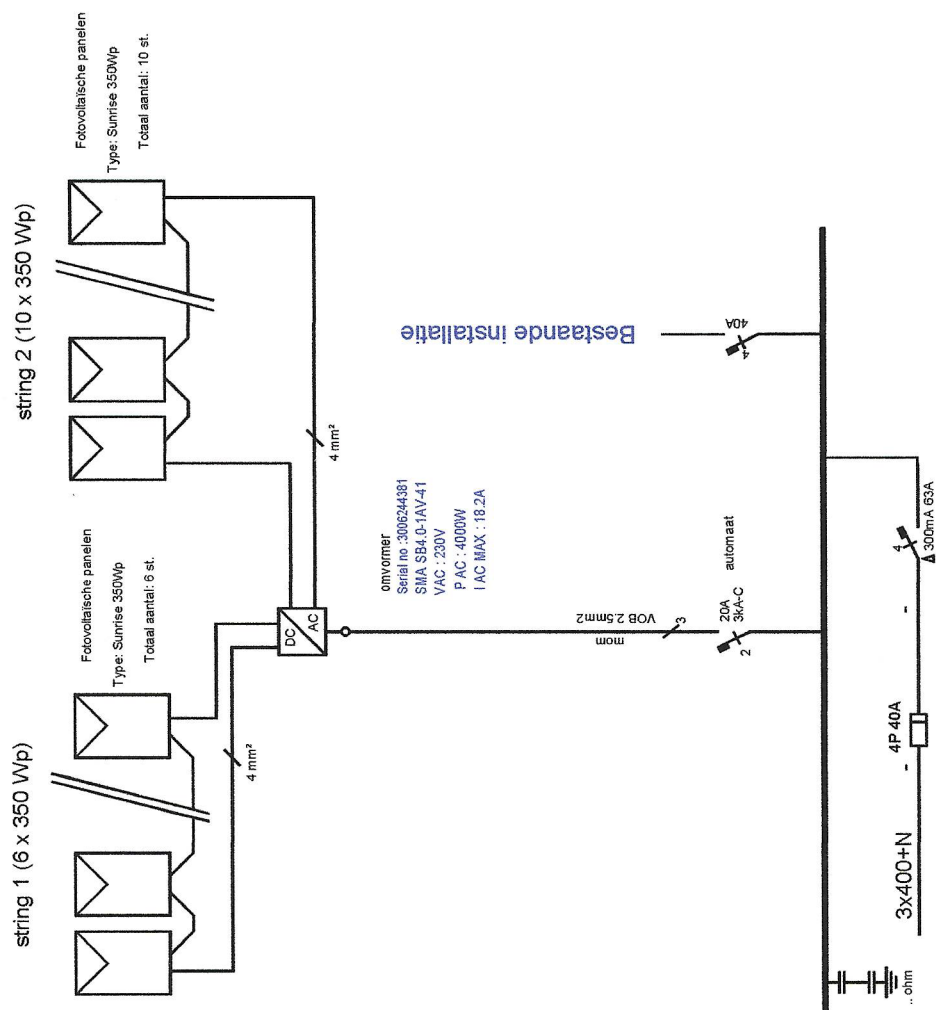

Afgev. erkend organisme

AV5433

21/06/2021

Verantw. uitvoering

Huistechnieken bv
BE0750.622.325Reigerstraat 13
9860 Oosterzele

Woning vooraan

Sunrise Full Black 350 Wp

Sunrise Full Black 350 Wp

Sunrise Full Black 350 Wp

Sunrise Full Black 350 Wp

Sunrise Full Black 350 Wp

Sunrise Full Black 350 Wp

