

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220825019004 Datum onderzoek: 25/08/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie:

Plaats van onderzoek: Eikeldreef 34, 9830 Sint-Martens-Latem (België)

Eig./Uitb./Beh.:  - Eikeldreef 34, 9830 Sint-Martens-Latem (België)

Uitvoerder: mon oonaer - e e ensdriesstraat 20A, 9770 Kruishoutem (België)

Bedrijf: Ond nr : BE0507816477

Type lokalen: Wooneenheid

Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019

Installatie van: voor 1981 1981-2020 na 1-6-2020 Herkeuring op : 25/08/2047

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:
DNB: Imewo
Nominale spanning: 3 x 400V + N
Hoofdbeveiliging: 40A
Voedingsleiding: 4 x 10 mm²
Elektrode type: Pen/Baren
Aantal borden: 2
Aantal stroombanen: 22+20
Waarde diff. inr: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
Diff. testknop: OK
Diff. foutlus: OK
Bescherming RA/OA: OK
staat vast elektrisch materieel: OK
R isolatie: 7.75 MOhm
R aarde: 10.4 Ohm
Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 2020

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 3x400V+N tot en met 40A.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 25/08/2047 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220825019004 Datum onderzoek: 25/08/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek


Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Jurgen Dierick**

Datum vrijgave: 25/08/2022

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220825019004 Datum onderzoek: 25/08/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

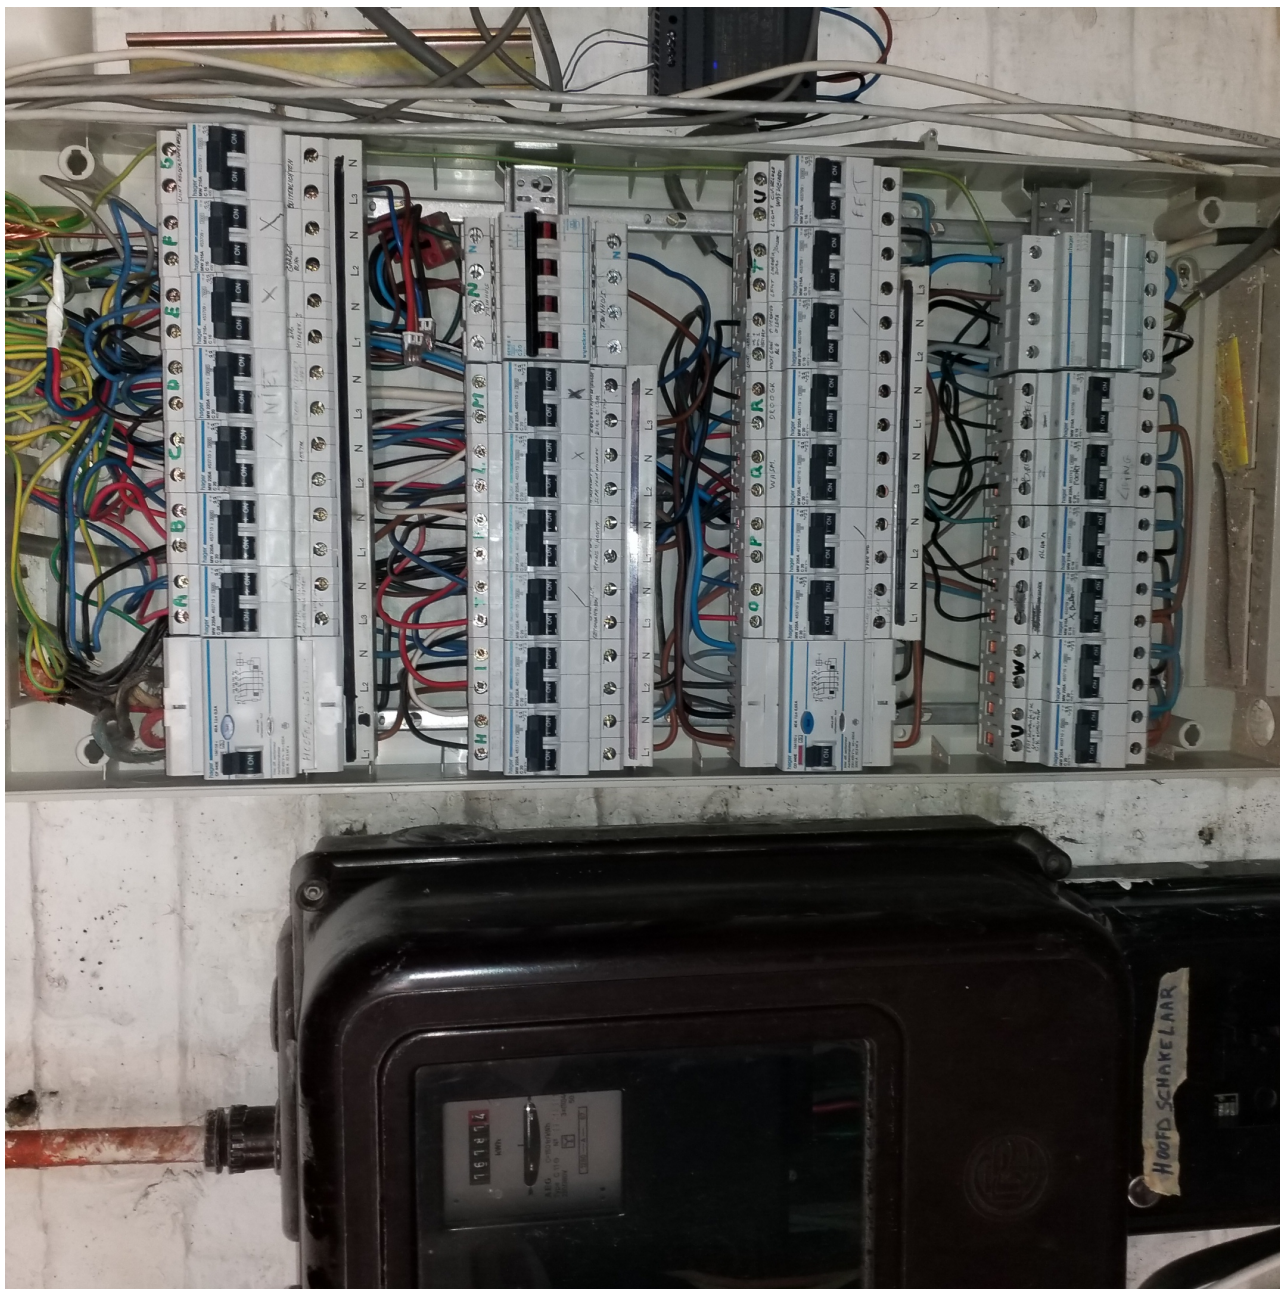

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220825019004

Datum onderzoek: 25/08/2022

Agent: Jurgen Dierick

volgens procedure TP01b

