



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. 30.3120.67.82/K



N **295185**

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West-Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Arment Froel</u>	Naam, voornaam : <u>[REDACTED]</u>
Ident. Kaart nr. : <u>887 40023</u>	Adres : <u>Heidesteige 3</u>
BTW nr. : <u>BE 887 40023</u>	Post nr. + Stad : <u>3830 Dr. H. Laere</u>
	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>9360263</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : <u>113281</u>		☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐		nr. : <u>1</u> meterstand : <u>1</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐		Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐		☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>6</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>U03</u>		<u>A. B. B. B. B.</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A <u>1</u> 300 mA	Aantal borden : <u>3</u>	Aantal eindstroombanen : <u>19</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ > doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>14</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil	
Opmerkingen	☐ Nihil	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.


☒ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : H. B. B. B. Agent nr. 312 Datum 28.12.2015

Bijlage(n) : 2 Situatieschema('s) : 2 ☒ Eéndraadsschema('s) : 2 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

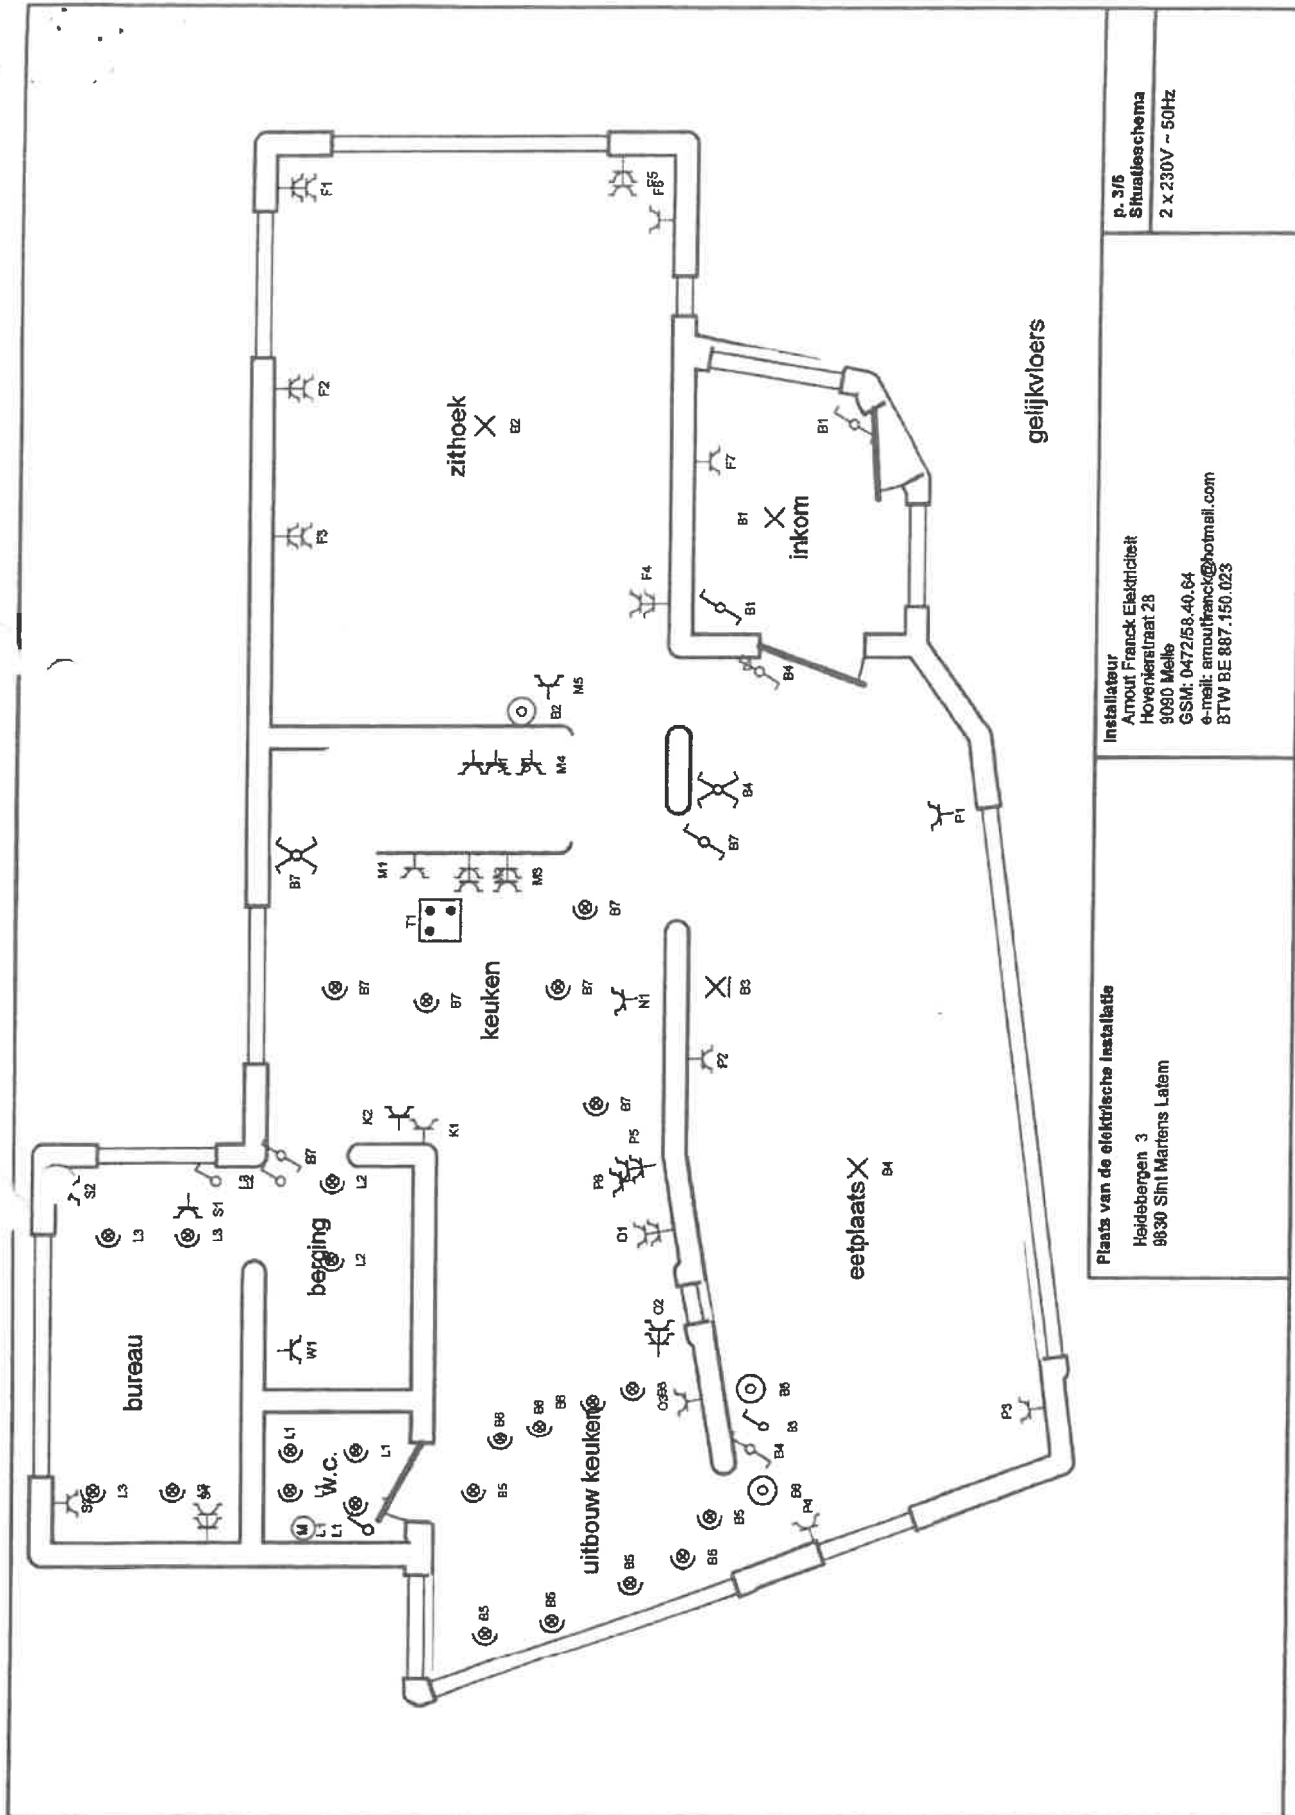

Plants van de elektrische installatie


Heidebergen 3
9830 Sint Martens Latem

Installateur
Arnout Franck Elektriciteit
Hovenersstraat 28
9080 Melle

GSM: 0472/58.40.64
e-mail: arnoutfranck@hotmail.com
BTW BE 887.150.023

p. 3/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

1ste verdiep

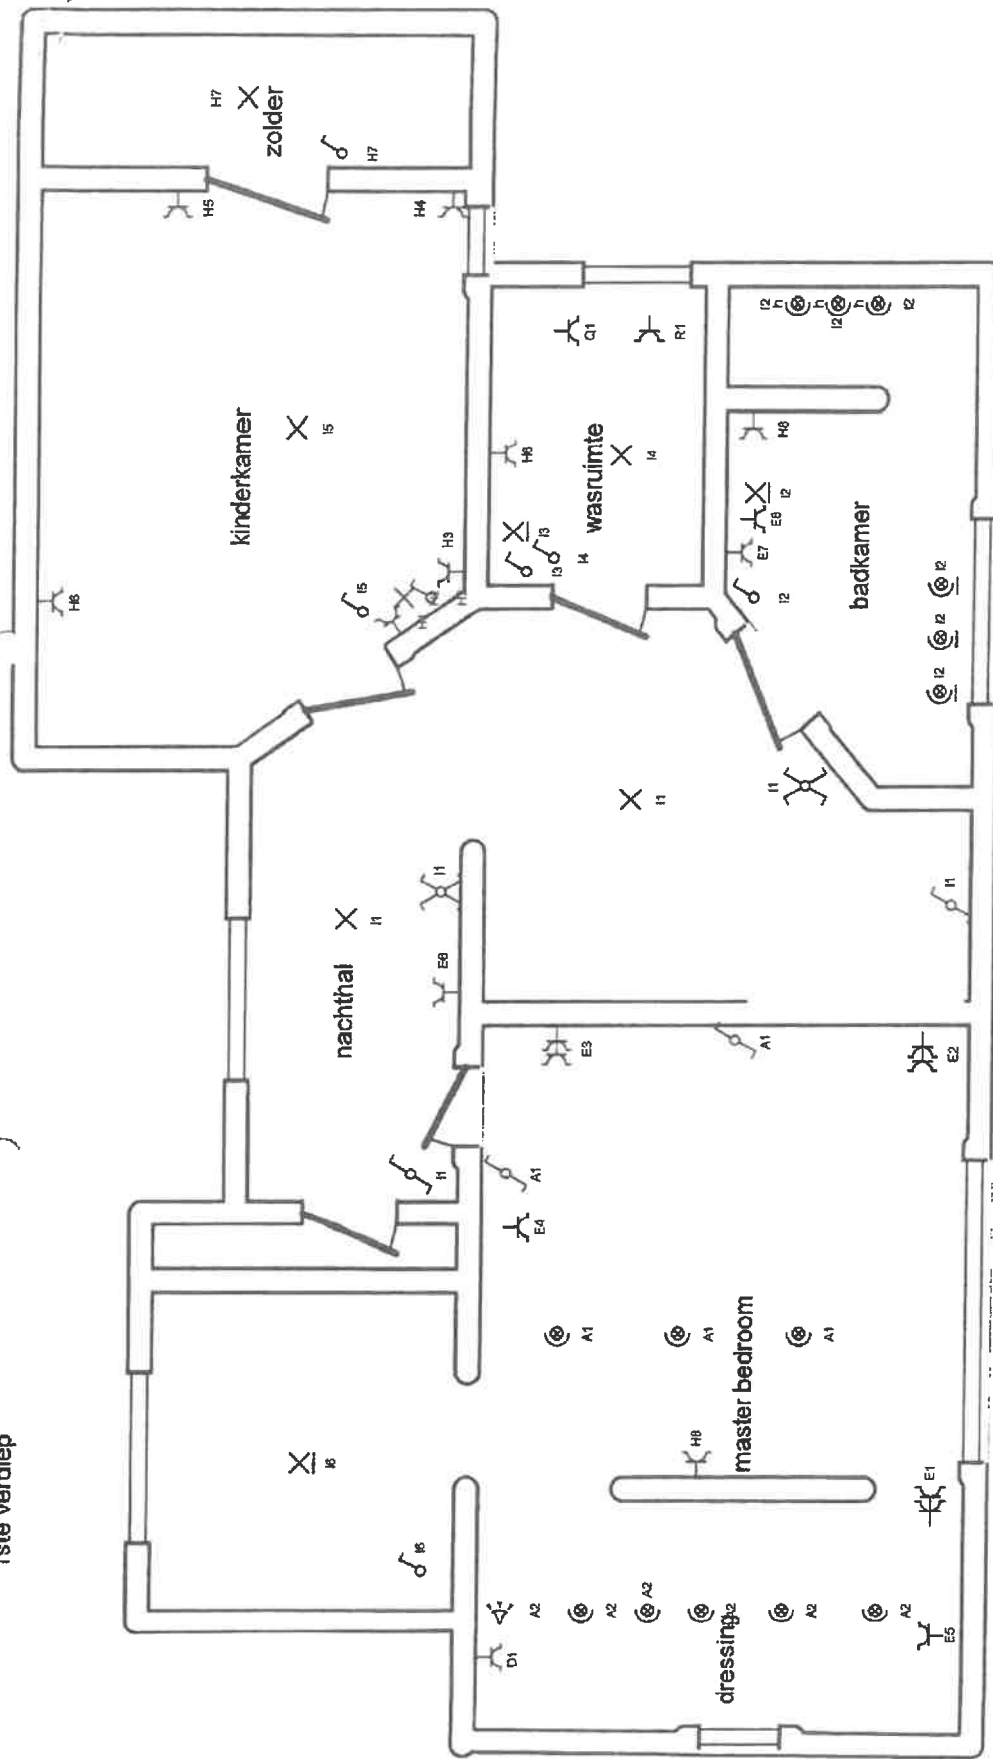

Plaats van de elektrische installatie

Heidebergen 3
9830 Sint Mariens Latem

Installateur
Arnout Franck Elektriciteit
Hovenstraat 28
9000 Melle

GSM: 047258.40.64
e-mail: arnoutfranck@hotmail.com
BTW BE 887.150.023

p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz



**Heidebergen 3
9830 Sint Mariens Laem**

InstaNatur

Amout Franck Elektriciteit
Hovenierstraat 28
9090 Melle
GSM: 0472/58.40.64
e-mail: amoutfranke@hotmail.com
BTW BE 887.150.023

P. 1/5

2 x 230V ~ 50Hz

p. 216
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Arnout Franck Elektriciteit
Hovenierstraat 28
9090 Melle
GSM: 0472/56.40.64
e-mail: arnoutfranck@hotmail.com
BTW BE 887.150.023

Plaats van de elektrische installatie
Heidebergen 3
8530 Sint-Martens-Latem



A: verlichting master bedroom + dressing

B: verlichting inkom+ zithoek+ wand eetplaats+ eetplaats+ uitbouw keuken +keuken boven toog+ keuken

C: alarm

D: stopcontact mastert bedroom dressing kant straat

E: stopcontacten master bedroom + nachthal + badkamer

F: stopcontacten zithoek

G: reserve

H: stopcontacten kinderkamer + wasruimte

I: verlichting boven uitgezonderd master bedroom

J: zekeringskast keuken

K: stopcontacten keuken in kast

L: verlichting w.c. + berging + bureau

M: dampkap+stopcontacten boven fornuis

N: vaatwas

O: stopcontacten keuken aan toog

P: stopcontacten eetplaats

Q: wasmachine

R: droogkast

S: stopcontacten bureau

T: fornuis

U: frigo

V: stopcontact tv

W: centrale verwarming

X: poolhouse

Plaats van de elektrische installatie
Heldbergen 3
9830 Sint Martens Latem

Installateur
Amout Frank Elektriciteit
Hoveniersstraat 28
9080 Melle
GSM: 0472/58.40.84
e-mail: amoutfrank@hotmail.com
BTW BE 887.150.023

p. 8/6
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz
